

โครงการ Andaz Resort Pattaya

รายงานการประชุม

เรื่อง: การประชุมเทคนิคและความปลอดภัย ครั้งที่ 49

วันและเวลา: วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:00 – 17:00 น.

สถานที่: ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการฯ

ผู้ร่วมประชุม	คุณสันทาน สุดตา	บริษัท ศาลาแดง เพลส จำกัด
	คุณทรงชัย บุญญพิชญกิจ	บริษัท ศาลาแดง เพลส จำกัด
	คุณชัยภูมิ สีเผือก	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด (PAC)
	คุณสุวรรณ เตไชยา	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด (PAC)
	คุณนคร นามแดง	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด (PAC)
	คุณฉัตรนกร ขวัญเมือง	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด (PAC)
	คุณเกียรติยศ ญาติพิมาย	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด (PAC)
	คุณอภิรัตน์ น้อยจันทร์	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด (PAC)
	คุณธนตร พิริยพันธุ์พงศ์	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด (PAC)
	คุณธีรศักดิ์ บุญเอื้อ	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด (PAC)
	คุณธีระพงษ์ แก้วฉิมพลี	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด (PAC)
	คุณวรพจน์ สิ้นสวัสดิ์	บริษัท ซี. อี. เอส. จำกัด (CES)
	คุณสุนทร เกตุอุ๊ต	บริษัท ซี. อี. เอส. จำกัด (CES)
	คุณศิวาจน์ บุษยากมลเศรษฐ์	บริษัท ซี. อี. เอส. จำกัด (CES)
	คุณประภาท บัวภา	บริษัท ซี. อี. เอส. จำกัด (CES)
	คุณธนศ นุตวงษ์	บริษัท ซี. อี. เอส. จำกัด (CES)
	คุณศศิธรณ์ ประระแส	บริษัท กาดเกสร จำกัด (KAD)
	คุณรุ่งรัตน์ เสรีรัตนชัยพร	บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด (QTC)
	คุณอภิญา มหะเสนีย์	บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด (QTC)
	คุณภาณิสรา พลพันธุ์	บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด (QTC)
	คุณภูวนาถ บุญรอด	บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด (QTC)
	คุณสุพจน์ พรกิตติเจริญ	บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด (QTC)
	คุณรัฐพล คล้ายสุวรรณ	บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด (QTC)
บันทึกโดย:	คุณประภาท บัวภา	บริษัท ซี. อี. เอส. จำกัด (CES)

ตรวจสอบโดย:	คุณวรพจน์ สีนสวัสดิ์	บริษัท ซี. อี. เอส. จำกัด (CES)
สำเนาเรียน:	คุณนพดล ใจชื่อ	บริษัท โปรเจ็ค แอลโลเอชั่น จำกัด (PAC)
	คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์	บริษัท โปรเจ็ค แอลโลเอชั่น จำกัด (PAC)
	คุณเอก พัฒนพิชัย	บริษัท โปรเจ็ค แอลโลเอชั่น จำกัด (PAC)
	คุณจิตรารีย์ รมยะไชยศิริ	บริษัท โปรเจ็ค แอลโลเอชั่น จำกัด (PAC)
	คุณพรรณนา นามิตรี	บริษัท โปรเจ็ค แอลโลเอชั่น จำกัด (PAC)
	คุณต้องกลม ชูรักานนท์	บริษัท โปรเจ็ค แอลโลเอชั่น จำกัด (PAC)
	คุณสุวิมล ประมวงค	บริษัท โปรเจ็ค แอลโลเอชั่น จำกัด (PAC)
	คุณทพุดิ อิศริยฤทธานนท์	บริษัท เอซีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ จำกัด (ACSI)
	คุณสิริศักดิ์ ศรีธาเจนสุข	บริษัท เอซีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ จำกัด (ACSI)
	คุณวรรณณันนัยน์ จำจันทร์	บริษัท เอซีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ จำกัด (ACSI)
	คุณธงชัย กวิสสร	บริษัท ซี อี เอส จำกัด (CES)
	คุณปิยะ อุทัยวิชานนท์	บริษัท ซี อี เอส จำกัด (CES)
	คุณวรพัฒน์ ไชยิตะมงคล	บริษัท ซี อี เอส จำกัด (CES)
	คุณสร้อยสุคนธ์ พรหมทอง	บริษัท กาดเกสร จำกัด (KAD)
	คุณวรรณช มูลทรัพย์	บริษัท กาดเกสร จำกัด (KAD)
	คุณกุลปาลิกา ปรณารม	บริษัท กาดเกสร จำกัด (KAD)

เอกสารแนบ

ที่	รายละเอียด	C.E.S. / จำนวนแผ่น	Q.T.C. / จำนวนแผ่น	KAD / จำนวนแผ่น
1.	ตารางตรวจสอบเครื่องมือ และเครื่องจักร	1		
2.	ตารางผลทดสอบคอนกรีต	1		
3.	ตารางผลทดสอบเหล็กเส้น	2		
4.	รายการสรุปเอกสารส่งขออนุมัติ	1		
5.	ตารางสรุปสถานะ NCR	2		
6.	3WEEK SCHEDULE	1		
7.	สรุปสถานะงานเปลี่ยนแปลง	3		

ที่	รายละเอียด	โดย	วันที่
1	วัตถุประสงค์ของการประชุม		
1.1	เพื่อติดตามประสานการทำงานลำดับ วิธีการและขั้นตอนทำงานของผู้รับเหมาแต่ละบริษัทสรุป ความปลอดภัยและชีวอนามัยและกฎระเบียบภายในโครงการในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา		
1.2	เพื่อติดตามเอกสาร (RFA, RFI, RFV, VO และอื่นๆ)		
2	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา		
2.1	CES ไม่ได้ได้รับความเห็นในรายการประชุม เทคนิคและความปลอดภัย ครั้งที่ผ่านมา จึงถือว่า รายงานดังกล่าวได้รับการรับรองโดยผู้ที่ได้รับ		
3	แจ้งเพื่อทราบ		
3.1	CES แจ้ง QTC. ติดตามงานย้ายบ่อพักด้านข้างอาคาร E1 เนื่องจาก CES ต้องใช้ Mobile Crane เข้าไปทำงานชั้นหลังคา ตามที่ได้แจ้งตอนประชุม Site Meeting วันที่ 28/10/63	CES	3/11/63
3.2	CES แจ้ง QTC. ติดตามงานปิดฝ้าเพดานอาคาร S5 จะให้ CES ปิดฝ้าได้วันไหน <u>/QTC แจ้ง ให้ ปิดฝ้าได้ วันที่ 5/11/63</u>	CES	3/11/63
3.3	CES แจ้ง NMT.,KEEN ติดตามมูลค่างาน เพื่อจะนำอาหารสดสัสด่วน ค่าน้ำ ค่าไฟ ของโครงการ / <u>NMT,KEEN แจ้งจะส่งให้ วันที่ 4/11/63</u>	CES	3/11/63
3.4	CES แจ้ง QTC งานขุดดินวางท่อต่างๆของ QTC. เมื่อกลับท่อแล้ว หากดินเหลือ QTC. ต้อง ดำเนินการขนย้ายดินออกเอง	CES	3/11/63
3.5	CES แจ้ง QTC งานระบบเหนือฝ้าชั้น1 (Corridor) อาคาร S5-S10 QTC เดินท่อขวางงานติดตั้ง Precast ของ CES ทำให้ CES ติดตั้ง Precast ไม่ได้ ขอให้ QTC.ย้ายแนวท่อที่กีดขวางด้วย / <u>QTC.แจ้งจะให้คำตอบวันที่ 4/11/63</u>	CES	3/11/63
3.6	CES แจ้ง QTC ส่งแผนงานปิดฝ้าเพดาน อาคาร G4,G5 ให้แล้ว	CES	3/11/63
3.7	QTC.แจ้ง CES เรื่องขอพื้นที่เพื่อเปิดงานขุดวางท่อระบบไฟฟ้า ด้านหลังอาคาร B ติดห้องน้ำ ชั่วคราวของ CES	QTC	3/11/63
3.8	QTC.แจ้ง CES เรื่องท่อน้ำฝนด้านหลังอาคาร S ที่ต้อง Coring คาน แต่ท่อน้ำมีระดับต่ำกว่า ระดับฝ้าเพดาน ต้องให้ CES ตัดท่อน้ำออกก่อน QTC จึงจะดำเนินการ Coring <u>/CES แจ้ง ยังไม่ได้รับแจ้งหรือมีเอกสารจาก PAC ให้ตัดท่อน้ำบริเวณดังกล่าว</u>	QTC	3/11/63
3.9	AI.แจ้ง QTC ติดตามแบบ Combine งานระบบกับงาน ID. / <u>QTC แจ้งจะส่งให้ วันที่ 7/11/63</u>	AI	3/11/63
3.10	AI แจ้ง CES ติดตามงานส่งมอบห้อง 304 อาคาร G3 <u>/CES แจ้งจะส่งให้ วันที่ 7/11/63</u>	AI	3/11/63
3.11	AI แจ้ง CES งานติดตั้ง Precast ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเก็บงานปิดรูผนัง ขอให้ CES เร่ง ดำเนินการด้วย	AI	3/11/63
3.12	AI.แจ้ง QTC.ติดตามเรื่องเอกสาร Inspection QTC.ไม่ตอบเอกสารกลับ ขอให้QTC.ตอบ เอกสารกลับภายใน3วัน ตามที่ตกลงกันในที่ประชุมด้วย และส่วนไหนที่ยังไม่สามารถทำได้ขอให้ แจ้งไว้ในเอกสาร พร้อมระบุวันที่จะสามารถทำได้ให้ครบถ้วน	AI	3/11/63
3.13	AI.แจ้งที่ประชุม วันที่11/11/63 จะมีอ่างอาบน้ำเข้ามาส่ง 15 ใบ(G3=8,G5=7) ส่วนที่เหลือ	AI	3/11/63

	วันที่ 30/11/63		
3.14	KEEN แจ้งที่ประชุมอาคาร V1(VL+SU-2) จะเริ่มงานฝ้า 11/11/63 อาคาร S5 (SU-1) จะเริ่มงานฝ้า 18/11/63	KEEN	3/11/63
3.15	KEEN แจ้ง PAC ติดตามเอกสาร RFI. ที่ส่งให้ PAC ยังไม่ได้รับการตอบกลับ	KEEN	3/11/63
3.16	KAD แจ้งเรื่องย้ายต้นลิลาวดี ข้างอาคาร D จะย้ายตอนที่ CES เริ่มงานบริเวณนั้น เนื่องจากต้องใช้เส้นทางเดียวกัน และขอให้ CES แจ้งวันที่จะเริ่มงานด้วย เพื่อ KAD จะได้เตรียมตัว	KAD	3/11/63
3.17	PAC แจ้งที่ประชุม เรื่องคุณภาพงาน เรื่องความปลอดภัย ขอให้แต่ละบริษัทตรวจสอบ และเคร่งครัดด้วย	PAC	3/11/63
3.18	PAC แจ้งที่ประชุม งานปิดทับทุกอย่าง ต้องส่งเอกสาร Inspection เช่นงาน ID. เมื่อขึ้นโครงแล้ว ต้องส่งเอกสาร Inspection ก่อนปิดผนัง	PAC	3/11/63
3.19	PAC แจ้ง CES ให้รับส่ง Shop Drawing บ่อ Water Treatment	PAC	3/11/63
3.20	PAC แจ้ง CES ติดตามงานบ่อน้ำบาดาล อาคารG3 ที่ต้องสกัดต่อปากบ่อ	PAC	3/11/63
3.21	SLP แจ้ง QTC ห้องนำสำนักงานของ QTC ส่งกลิ่นเหม็น ให้เร่งแก้ไข	SLP	3/11/63
3.22	SLP แจ้ง CES ให้รับทำความสะอาดหลังคา อาคาร V2 ที่มีรอยคราบน้ำปูน	SLP	3/11/63
4.	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา		3/11/63
4.1	CES แจ้ง QTC, PAC แผนงานเทคอนกรีต อาคาร E1 ชั้น3 ครึ่งหลัง จะเท วันที่30/10/63 อาคาร E2 ชั้น2 จะเทวันที่ 31/10/63 ขอให้ QTC.ช่วยเร่งรัดงานให้จบก่อนถึงวันเทคอนกรีตด้วย เนื่องจากเป็นการเทคอนกรีตที่มีปริมาณมาก CES จะได้เริ่มเทตอนเช้า	CES	บันทึก
4.2	CES แจ้ง QTC อาคาร B โซน8 CES กำลังถอดแบบนั่งร้าน และจะแล้วเสร็จ 28/10/63 QTC. สามารถเริ่มงานได้ 29/10/63 และจะเดินท่อแล้วเสร็จวันไหน / <u>QTC. แจ้งจะแล้วเสร็จ 7/11/63</u>	CES	27/10/63
4.3	CES สอบถาม QTC อาคารA โซน1 จะส่งพื้นที่ให้ CES เริ่มงานพื้นที่ชั้น1 ได้วันไหน / <u>QTC แจ้งจะแล้วเสร็จวันที่ 6/11/63 และจะส่งพื้นที่ให้ CES 7/11/63</u>	CES	27/10/63
4.5	CES แจ้ง QTC อาคาร G4 มีผนังที่ QTC แจ้งว่ายังฉาบไม่ได้ ปัจจุบันก็ยังไม่ได้ฉาบ CES รอมา กว่า 2 เดือนแล้ว จะให้ CES ฉาบได้วันไหน / <u>ฉาบแล้ว</u>	บันทึก	27/10/63
4.6	CES แจ้ง QTC งานระบบไฟฟ้าบริเวณบันได ยังไม่ได้เดินระบบไฟฟ้า CES จะเริ่มฉาบผนังบริเวณนี้แล้ว ขอให้ QTC เร่งดำเนินการด้วย / <u>QTC แจ้งแบบเปลี่ยนต้องกรีดแล้วเดินระบบไฟฟ้าใหม่</u>	ติดตาม	27/10/63
4.7	QTC แจ้ง CES ขอแบบ TRECH อาคาร D / <u>CES แจ้งมีอยู่ใน Shop Drawing แล้ว และจะส่งเข้าไปอีกครึ่งหลังประชุม/ QTC แจ้งได้รับแบบแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าขนาดเพียงพอหรือไม่</u>	ติดตาม	27/10/63
4.8	QTC.แจ้ง CES งานสกัดคอนกรีตหยาบ อาคาร B5 ยังไม่แล้วเสร็จ / <u>CES แจ้งเหลือประมาณ 50 ซม.จะแล้วเสร็จภายในวันนี้/แล้วเสร็จ</u>	บันทึก	27/10/63

4.9	AI.แจ้งที่ประชุม ปัจจุบันเฟอร์นิเจอร์เริ่มเข้าหน้างานแล้ว ขอให้ CES ,QTC เร่งดำเนินการแก้ไขผนังที่มีรอยร้าวด้วย	ติดตาม	27/10/63
4.10	PAC แจ้งที่ประชุม เรื่องใบ Inspection กรณีที่ส่งครบ 3 วันแล้ว ไม่มีการตอบเอกสารกลับ ขอให้แนรายงานการประชุม และใบเซ็นด์ซื้อแนบใบ Inspection ด้วย	บันทึก	27/10/63
4.11	PAC แจ้ง CES ปัจจุบันมีสุนัขเข้ามาในพื้นที่โครงการ ขอให้ CES หาวิธีจัดการ	ติดตาม	27/10/63
4.12	PAC แจ้ง CES เรื่องต้นไม้ที่จำเป็นต้องตัด ต้องย้าย ขอให้รีบดำเนินการ	ติดตาม	27/10/63
4.13	PAC แจ้งที่ประชุม เรื่อง Payment ขอให้ทำเอกสาร Support ให้แนบหนาเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ง่าย	ติดตาม	27/10/63
4.14	PAC แจ้งที่ประชุมเรื่องเครื่องมือวัดต่างๆ ขอให้ตรวจสอบอย่าให้หมดอายุ	ติดตาม	27/10/63
4.15	PAC แจ้ง QTC งานระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ ต้องทำการ PROTECT ให้ดี	ติดตาม	27/10/63
4.16	SLP แจ้ง CES ขอให้ตรวจสอบทางเชื่อมอาคาร G5 ด้วย เนื่องจากมีรอยร้าวที่คาน	ติดตาม	27/10/63
4.17	CES แจ้ง PAC , QTC ติดตามงานฉาบผนังชั้น1 อาคาร D ที่ยังไม่สามารถฉาบได้ CES จะสามารถฉาบได้ทั้งหมดวันที่ทำไหร (CES ก่ออิฐเสร็จตั้งนานแล้ว)/ <u>QTC.แจ้งจะตอบเอกสารให้แล้ว โชนห้องครัวฉาบได้วันที่ 6/11/63, โชนห้องน้ำ วันที่ 10/11/63</u>	ติดตาม	20/10/63
4.18	AI. แจ้ง QTC ให้ Combine แบบ Second Fix ด้วย ขอห้อง Type SK-1,SK-2,ST-1,ST-2 ก่อน / QTC แจ้งจะส่งให้ภายในวันที่ 2/11/63 <u>QTC แจ้งจะส่งทั้งหมดวันที่ 7/11/63</u>	AI	20/10/63
4.19	SLP แจ้ง CES เรื่องการขอบ้านเลขที่ของโครงการ ขอให้ CES นำบ้านเลขที่มาให้ Owner พิจารณาเลือกก่อน / <u>CES แจ้งอยู่ระหว่างดำเนินการ</u>	ติดตาม	20/10/63
4.20	SLP แจ้ง QTC เรื่องขอหมายเลขโทรศัพท์ของโครงการ ให้ QTC นำหมายเลขโทรศัพท์ มาให้ Owner พิจารณาเลือกก่อน / <u>QTC แจ้งอยู่ระหว่างดำเนินการ</u>	ติดตาม	20/10/63
4.21	SLP แจ้ง PAC เรื่องขนาดแท่งค้ำน้ำข้างบน ขนาด 6.00x5.00x2.50 m./ <u>PAC ประสานงานต่อ</u>	บันทึก	20/10/63
4.22	SLP แจ้ง QTC. เรื่องช่อง BLOCK OUT ที่ผนัง Retaining wall (หลังอาคาร D) จะเทเก็บวันไหน และให้รีบเดินท่อบริเวณนี้ให้จบ จะให้ CES ถมดินส่วนนี้ให้จบกันต้นไม้ล้ม / <u>QTC. แจ้งจะเปิดดินเดินท่อวันที่ 5/11/63</u>	ติดตาม	20/10/63
4.23	KEEN แจ้ง CES จะเริ่มเข้าพื้นที่อาคาร อาคาร V1 และอาคาร S5(SU-1)ก่อน ในวันจันทร์ที่ 26/10/63 ขอให้ CES ,QTC เคลียร์งานในส่วนของตนเองที่เหลืออยู่ให้แล้วเสร็จด้วย / <u>QTC เหลืองานระบบเหนือฝ้า,CES เหลือเก็บงานฉาบ</u>	ติดตาม	20/10/63
4.24	PAC แจ้ง QTC ให้เพิ่มแรงงานให้เพียงพอกับงานในปัจจุบันด้วย เนื่องจากหลายพื้นที่ไม่มีคนทำงาน / <u>QTC แจ้งเพิ่มแรงงาน(SN)มาแล้ว 6 คน ที่อาคาร S1-S4</u>	ติดตาม	20/10/63
4.25	PAC แจ้งให้ QTC ติดตั้ง Panic Alarm ย้ายมาติดฝ้าหน้าห้องแทน	บันทึก	6/10/63
4.26	PAC แจ้งให้ QTC Combine ฝ้าอาคาร G ทุกระบบ/ <u>QTC แจ้งจะส่งให้PAC 26/10/63/แจ้งเหลือ G2 จะส่ง 2/11/63, G4 จะส่งวันที่ 6/11/63</u>	ติดตาม	6/10/63
4.27	PAC แจ้งให้ QTC ส่ง Drawing Register / <u>QTC.ส่งแล้ว / PAC แจ้งให้ปรับแก้อีกครั้ง/QTC แจ้งจะส่งภายในวันที่ 30/10/63 / ขอเลื่อนเป็นวันที่ 9/11/63</u>	ติดตาม	6/10/63

4.28			
4.29	PAC สอบถาม โคมไฟ หน้าห้อง Mock Up บริเวณ corridor จะมาติดตั้งเมื่อไหร่ /ติดตั้งแล้ว	บันทึก	6/10/63
4.30	CES แจ้ง QTC. ติดตามงาน Coring FD. อาคาร G,S / <u>OTC.แจ้งจะส่งแผนให้ CES 23/9/63 และจะส่งแบบให้ Designer พิจารณา 30/10/63 / PAC แจ้ง CES ให้ดำเนินการไปเลยไม่ต้องรอ</u>	ติดตาม	6/10/63
4.31	CES แจ้ง QTC รื้อโครงการที่ชำรุด ที่เกิดจากการทำงานของ QTC. จะต้องซ่อมแซม/เปลี่ยน/แก้ไขให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม	ติดตาม	6/10/63
4.32	QTC.แจ้ง CES ขอติดตามงานฉาบผนังห้องไฟฟ้า ขอแผนส่ง QTC.ด้วย / CES แจ้งจะเริ่มอาคาร G5 ก่อน จะส่งแผนให้ 28/9/63 / <u>CES ส่งแผนให้แล้วส่วนที่สามารถฉาบได้ทาง CES ฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่วนที่เหลือติดงาน OTC / CESแจ้ง QTC ให้แก้ไขเรื่องน้ำด้วย ปัจจุบันมีน้ำไหลลงมาตามผนัง ทำให้ทาสีรองพื้นไม่ได้ จะเริ่มทาสีรองพื้น 10/11/63</u>	ติดตาม	6/10/63
4.33	AI. แจ้ง CES ขอแผนส่งมอบห้องส่วนที่เหลือ / <u>CES แจ้งจะส่งแผนให้ 26/10/63 ส่งแล้ว</u>	บันทึก	6/10/63
4.34	PAC แจ้ง CES ขอให้ชี้จุดทำความสะอาดประจำอาคาร เนื่องจากปัจจุบันเป็นหน้าฝน ได้มีฝนสาด ทำให้มีน้ำขังในตัวอาคาร / <u>CES แจ้งได้จัดการกวาดเก็บน้ำแล้ว แต่ไม่สามารถจะจัดเก็บได้ทั้งหมด เนื่องจาก OTC. ยังไม่ได้ต่อท่อน้ำฝน PACแจ้งเพิ่มเติมขยบนชั้นดาดฟ้าให้เร่งเคลียร์ด้วย</u>	PAC	ติดตาม
4.35	PAC แจ้ง CES,QTC ให้ตรวจสอบบริเวณที่ต้องขุดดินเพื่อทำงาน ขอให้ระมัดระวังและหาวิธีป้องกันดินพังด้วย เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกบ่อย	บันทึก	6/10/63
4.36	AI. แจ้ง PAC อาคาร G5.3 มีคาน คสล. ติดรางม่าน ไม่สามารถติดตั้งม่านตามระดับได้ / <u>PAC แจ้ง AI ให้ตรวจสอบระดับว่าสามารถทำได้สูงที่สุดที่ระดับเท่าใด / AI. แจ้ง G5.3+G3.2 ทั้งชั้น 1 และชั้น 2 ประมาณ 20 ห้อง AI.จะทำเอกสารส่ง PAC อีกครั้ง/ AI.แจ้งรอเอกสารตอบกลับ/ AI แจ้งได้ข้อสรุปแล้ว ลดระดับลงมา 10 ซม. จากระดับ+2.90 ม. เป็น +2.80 ม.</u>	บันทึก	6/10/63
4.37	PAC แจ้ง CES ให้ส่ง Method -งานหลังคากระจก ของอาคาร D -งาน Site Drainage <u>/CES แจ้งงานหลังคากระจกอาคาร D อยู่ในขั้นตอนการสรุป Supplier เมื่อสรุปแล้ว CES จะส่ง Method ให้ PAC</u>	ติดตาม	6/10/63
4.38	PAC สอบถาม CES,QTC อาคาร D ที่ไม่ได้ฝัง Sleeve ไว้ 2 จุด จะแก้ไขเมื่อไหร่/ <u>OTC.แจ้งจะให้คำตอบวันที่ 13/8/63 / OTC. แจ้งจะเริ่มทำพร้อมกลุ่มอาคาร S</u>	QTC	ติดตาม
4.39	CES. สอบถาม PAC งาน Ramp และรื้อ บริเวณอาคาร D.ด้านนาวินปาร์ค (พื้นที่การะจ่ายยอม) สามารถดำเนินการได้หรือไม่ / PAC แจ้งสามารถทำได้เลย และให้รับส่ง RFI. ด้วย / <u>CES แจ้งส่ง RFI.แล้ว แต่ยังไม่สามารถทำงานได้ นาวินปาร์คไม่ยอมให้ขยับรื้อชั่วคราว/PAC,SLP แจ้งรอข้อสรุป และจะมีการปรับแบบด้วย / PAC แจ้ง CES สามารถทำได้ โดยให้ทำหนังสือขอเข้าพื้นที่พร้อมแผนงานส่ง นาวินปาร์ค/ CES ส่งหนังสือพร้อมแผนงานให้นาวินปาร์ค</u>	CES	ติดตาม

	แล้ว/ นาวินปาร์คแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม		
4.40	PAC แจ้ง CES ให้เคลียร์กิ่งไม้ที่ตัดออกนอกโครงการ / CES แจ้งอยู่ทยอยขนออกทุกสัปดาห์พร้อมขยะ	PAC	ติดตาม
5	ความปลอดภัย และชีวอนามัย		
5.1	PAC แจ้ง CES งานติดตั้งเชื่อม ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดไฟ และควรมีถังดับเพลิงด้วย	ติดตาม	
6	เรื่องติดตาม งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานระบบ และประตูหน้าต่างอลูมิเนียม		
6.1			
7	แผนงานก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน		
7.1	PAC แจ้งให้ CES,QTC ส่ง Weekly Report ส่งทุกวันจันทร์ ภายในเวลา 13.00 น.	CES, QTC	ติดตาม
ที่	รายละเอียด	โดย	วันที่
8	เรื่องการทดสอบวัสดุและตรวจสอบเครื่องมือ-เครื่องจักร		
8.1	ตารางตรวจสอบเครื่องมือและเครื่องจักร (Up Date เป็นเอกสารแนบ)		
8.2	ตารางผลทดสอบคอนกรีต (Up Date เป็นเอกสารแนบ)		
8.3	ตารางผลทดสอบเหล็กเส้น (Up Date เป็นเอกสารแนบ)		
9	เรื่องขออนุมัติแบบ Shop Drawing และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง		
	Up Date เป็นเอกสารแนบ		
10	สรุปสถานะงานเปลี่ยนแปลง		
	Up Date เป็นเอกสารแนบ		
11	เรื่องคุณภาพงานก่อสร้าง		
11.1	PAC แจ้งเรื่องการออกเอกสารNCR เพื่อแจ้งให้แก้ไขคุณภาพในงานก่อสร้าง โดยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อน 1 วัน เพื่อให้ทำการแก้ไขก่อน หากไม่ดำเนินการแก้ไขทาง PAC จะดำเนินการออกเอกสาร NCR แจ้งเตือน Up Date เป็นเอกสารแนบ	QTC/CES ติดตาม	
12	อื่นๆ ปัญหาอุปสรรค		
12.1	CES แจ้ง PAC อาคาร A,B เริ่มงานแล้ว ขอให้PAC ช่วยติดตามแบบห้องน้ำที่เป็น Scope ของ ID.ด้วย	ติดตาม	
13	กำหนดการประชุมครั้งต่อไป		
	วันอังคารที่ 10 พ.ย. 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมโครงการ	ทุกฝ่าย	

รายงานการประชุมนี้เป็นความเข้าใจเนื้อหาการประชุมของผู้บันทึก หากมีความเห็นใดๆ กรุณาแจ้งให้ผู้บันทึกทราบภายใน 7 วันตามปฏิทิน นับจากได้รับรายงานประชุมนั้น มิฉะนั้นจะถือว่ารายงานการประชุมนี้เป็นที่ยอมรับโดยผู้ที่ได้รับ

WEEKLY SCHEDULE REPORT

PROJECT NAME : ANDAZ RESORT PATTAYA
OWNER : บริษัท ศาลาแดงเพลสจำกัด
CONTRACTOR : บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด

[illegible]

ผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีต(ก้อนปูน) up date 21/9/2020

อาคาร	D			E1			E2			F3.1,F3.2,F2.1			G1			G2			G3			G4			G5			S1,S2			S3,S4			S5,S6			S7,S8			S9,S10			V1,V2			V3,V4						
	วันที่เก็บ	Days	Ksc.(cube)	วันที่เก็บ	Days	Ksc.(cube)	วันที่เก็บ	Days	Ksc.(cube)	วันที่เก็บ	Days	Ksc.(cube)	วันที่เก็บ	Days	Ksc.(cube)	วันที่เก็บ	Days	Ksc.(cube)	วันที่เก็บ	Days	Ksc.(cube)	วันที่เก็บ	Days	Ksc.(cube)	วันที่เก็บ	Days	Ksc.(cube)	วันที่เก็บ	Days	Ksc.(cube)	วันที่เก็บ	Days	Ksc.(cube)	วันที่เก็บ	Days	Ksc.(cube)	วันที่เก็บ	Days	Ksc.(cube)	วันที่เก็บ	Days	Ksc.(cube)										
ชั้นใต้ดิน	14/3/2020	7	332		7	-	17/2/2020	7	318		7			7	-		7	-		7	-		7	-	-	7	-		7			7			7			7				7			7							
		14	392		14	-		14	390		14			14	-		14	-		14	-		14	-	-	14	-		14			14			14			14			14			14								
		28	443		28	-		28	442		28			28	-		28	-		28	-		28	-	-	28	-		28			28			28			28			28			28								
ฐานราก	15/6/2020	7	323		7			7			7		15/2/2020	7	290	17/3/2020	7	290	15/3/2020	9	286	15/12/2019	7	312	1/12/2019	7	277	26/4/2020	7	309	30/4/2020	7	314	5/12/2019	7	285	26/2/2020	7	335	15/2/2020	7	312	16/3/2020	7	343		7			7		
		14	389		14			14			14	352		14	328		14	315		14	398		14	369		14	361		14	388		14	342		14	413		14	385		14	392		14				14				
		28	435		28			28			28	440		28	465		28	432		28	456		28	450		28	435		28	465		28	468		28	460		28	460		28	443		28				28				
คานาชั้น1	24/4/2020	7	318	21/2/2020	7	315		7		18/7/2020	7	322	26/2/2020	7	316	15/3/2020	7	312	28/3/2020	7	318	26/12/2019	7	280	6/1/2020	7	303	2/5/2020	7	315	15/5/2020	7	341	6/3/2019	7	339	13/3/2020	7	314	1/3/2020	7	345	1/3/2020	7	313	19/7/2020	7	387		7		
		14	401		14	384	14		14		409	14		420	14		398	14		414	14		397	14		405	14		431	14		414	14		413	14		384	14		410	14		385	14		417		14			
		28	446		28	434	28		28		457	28		482	28		469	28		466	28		450	28		453	28		476	28		442	28		465	28		444	28		469	28		439	28		459		28			
พื้นชั้น1	24/4/2020	7	318		7		7		18/7/2020	7	322	10/4/2020	7	307	17/4/2020	7	326	20/4/2020	7	348	19/3/2020	7	306	22/3/2020	7	326	16/5/2020	7	319	15/5/2020	7	341	6/3/2019	7	339	13/3/2020	7	314	13/3/2020	7	313	1/3/2020	7	313	19/7/2020	7	387		7			
		14	401	14		14		14		409	14		403	14		394	14		432	14		396	14		403	14		410	14		414	14		413	14		384	14		387	14		385	14		417		14				
		28	446	28		28		28		457	28		468	28		460	28		498	28		435	28		448	28		443	28		442	28		465	28		444	28		444	28		439	28		459		28				
เสาชั้น1-ชั้น2	10/5/2020	7	310	20/2/2020	7	313		7			7		6/3/2020	7	312	19/3/2020	7	306	10/3/2020	7	293	8/1/2020	7	345	9/1/2020	7	314	25/5/2020	7	326	20/5/2020	7	310	10/3/2020	7	333	20/3/2020	7	318	20/3/2020	7	321	10/3/2020	7	348		7			7		
		14	395		14	383	14		14			14		410	14		397	14		364	14		410	14		411	14		401	14		356	14		397	14		414	14		333	14		387	14		387	14			14	
		28	438		28	434	28		28			28		469	28		448	28		482	28		469	28		462	28		478	28		438	28		476	28		466	28		441	28		460	28				28			
คานา+พื้นชั้น2		7			7		7			7		11/3/2020	7	298	4/4/2020	7	299	18/4/2020	7	310	2/2/2020	7	321	19/1/2020	7	337	10/6/2020	7	290	6/6/2020	7	318	25/3/2020	7	337	3/4/2020	7	339	25/2/2020	7	332		7			7						
		14		14		14			14				14	384		14	384		14	402		14	410		14	392		14	328		14	414		14	416		14	420		14	415		14			14						
		28		28		28		28			28		442	28		493	28		494	28		465	28		420	28		465	28		420	28		465	28		466	28		463	28		459	28	462	28			28			
เสาชั้น2-ชั้น3		7			7		7			7		25/3/2020	7	306	10/4/2020	7	296	26/4/2020	7	315	16/2/2020	7	333	9/2/2020	7	330	16/6/2020	7	341	18/6/2020	7	325	3/4/2020	7	350	7/4/2020	7	333	2/4/2020	7	324		7			7						
		14		14		14			14				14	388		14	373		14	396		14	386		14	389		14	414		14	395		14	421		14	417		14	417		14			14						
		28		28		28		28			28		475	28		465	28		443	28		448	28		415	28		442	28		438	28		496	28		463	28		464	28				28							
คานา+พื้นชั้น3		7			7		7			7			7			7		10/5/2020	7	298	5/3/2020	7	333	22/2/2020	7	321		7			7			7			7			7			7									
		14		14		14		14			14			14	387	14	414		14			14				14			14		14		14		14		14		14													
		28		28		28		28			28			28	462	28	463		28	430		28			28			28		28		28		28		28		28														
เสาชั้น3-ชั้นหลังคา		7			7		7			7			7			7		19/5/2020	7	302		7			7			7			7			7			7			7			7									
		14		14		14		14			14			14	368	14			14			14			14			14		14		14		14		14		14														
		28		28		28		28			28			28	432	28			28			28			28			28		28		28		28		28																
พื้นชั้นหลังคา	10/5/2020	7	334		7		7			7		30/4/1963	7	318		7			7		23/5/2020	7	325		7			7			7			7			7			7												
		14	401	14		14		14		14	375		14		14	394	14		14			14		14		14		14		14		14		14		14																
		28	460	28		28		28		28		28	458	28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28														

ตารางตรวจสอบเครื่องมือและเครื่องจักรกล (โครงการ ANDZA RESORT PATTAYA)

ที่	เครื่องมือ/อุปกรณ์/รุ่น	วันที่ไปรับรองหมดอายุ	วันที่ตรวจสอบครั้ง1	วันที่ตรวจสอบครั้ง2	วันที่ตรวจสอบครั้ง3	วันที่ตรวจสอบครั้ง4	วันที่ตรวจสอบครั้ง5
1	Backhoe PC 60	ตรวจสอบทุกวันทำงาน	ตรวจสอบทุกวันทำงาน	ตรวจสอบทุกวันทำงาน	ตรวจสอบทุกวันทำงาน	ตรวจสอบทุกวันทำงาน	
2	Backhoe PC 120	ตรวจสอบทุกวันทำงาน	ตรวจสอบทุกวันทำงาน	ตรวจสอบทุกวันทำงาน	ตรวจสอบทุกวันทำงาน	ตรวจสอบทุกวันทำงาน	
3	Backhoe PC 120	ตรวจสอบทุกวันทำงาน	ตรวจสอบทุกวันทำงาน	ตรวจสอบทุกวันทำงาน	ตรวจสอบทุกวันทำงาน	ตรวจสอบทุกวันทำงาน	
4	Mobile Crane 25ตัน 001	09/12/2563	11/02/2562	09/03/2563	09/06/2563	09/09/2563	
5	Mobile Crane 25ตัน 002	17/11/2563	17/08/2563				
6	กล้องระดับ 001	17/03/2563	05/02/2563	17/09/2563			
7	กล้อง Total Station	29/12/2563	30/09/2562	05/02/2563	05/08/2563	29/06/2563	


****หมายเหตุ กรณีมีการแก้ไขเครื่องจักรจะทำการตรวจ ปจ.ทุกครั้งก่อนเริ่มใช้งาน โดยที่ไม่ต้องรอให้ครบกำหนดตรวจทุก 3 เดือน


ตารางสรุป SI	จำนวนเอกสาร	จำนวนออก VO	จำนวนคงเหลือ
SI-STR	27	6	21
SI-ARC	7	2	5
SI-SAN	1	0	1
SI-K&L	1	0	1
SI-ELE	1	0	1
SI-HARD	1	0	1
SI-AIR	1	0	1
SI-LAN	4	0	4
ยอดรวมทั้งหมด	43	8	35

ตารางสรุป NCR	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่ปิดแล้ว	จำนวนคงเหลือ
NCR-SAF	11	6	5
NCR-STR	52	31	21
NCR-ARC	37	3	34
ยอดรวมทั้งหมด	100	40	60

SI - SAN					
ลำดับ	วันที่รับ	เลขที่เอกสาร	เรื่อง	เอกสารอ้างอิง	เลขที่ VO
1	17/04/2020	SI.1909.200312.CES.ECH.#1(SAN-002)	Sanitary System Drawing for Construction		
SI - K&L					
ลำดับ	วันที่รับ	เลขที่เอกสาร	เรื่อง	เอกสารอ้างอิง	เลขที่ VO
1	17/04/2020	SI.1909.200310.CES.STA#1(K&L001)	แบบ Kitchen & Laundry for tender drawing สำหรับโครงการ Andaz Resort Pattaya		
SI - ELE					
ลำดับ	วันที่รับ	เลขที่เอกสาร	เรื่อง	เอกสารอ้างอิง	เลขที่ VO
1	17/04/2020	SI.1909.200312.CES.ECH.#1(ELE-002)	Electrical and Communication System Drawing for Construction		
SI - HARD					
ลำดับ	วันที่รับ	เลขที่เอกสาร	เรื่อง	เอกสารอ้างอิง	เลขที่ VO
1	29/01/2020	SI.1909.200107.CES.KY.#1 (HARD-002)	ขอนำส่งแบบ For Construction Drawing - Hardscape Rev.01 ลงวันที่ 25/12/19		
SI - AIR					
ลำดับ	วันที่รับ	เลขที่เอกสาร	เรื่อง	เอกสารอ้างอิง	เลขที่ VO
1	17/04/2020	SI.1909.200312.CES.ECH.#1(AIR-002)	Air Condition Drawing for Construction		
SI - LAN					
ลำดับ	วันที่รับ	เลขที่เอกสาร	เรื่อง	เอกสารอ้างอิง	เลขที่ VO
1	04/06/2020	SI.1909.190927.CES.STA.#1(LAN-003)	แบบ Landscape Architectural Drawing For Construction Package - Hardscape		
2	03/10/2020	SI.1909.191002.CES.STA.#1(LAN-006)	แบบ Landscape Architectural Drawing For Construction Package - Softscape		
3	17/12/2020	SI.1909.191217.CES.KY.#1(LAN-009)	นำส่งข้อมูลแบบ For Construction KEY PLAN (LA-100) Rev.01 จาก Designer PLA		
4	17/10/2019	SI.1909.200408.CES.KY.#1(LAN-013)	นำส่งแบบ Softscape For Construction Rev.2 จาก Designer : PLA		
SI - ARC					
ลำดับ	วันที่รับ	เลขที่เอกสาร	เรื่อง	เอกสารอ้างอิง	เลขที่ VO
1	17/04/2020	SI.1909.190926.CES.STA.#1(ARC-001)	Architectural Drawing For Construction		RFV-CES/PAC/STR/001
2	17/04/2020	SI.1909.191112.QTC.KY.#1(ARC-004)	ขอนำส่งแบบลิฟท์ HITACHI สำหรับอาคาร E1, G3, G4, G5		
3	17/04/2020	SI.1909.200107.CES.KY.#1(ARC-005)	ขอนำส่งแบบ For Construction Drawing Rev.02 สำหรับอาคาร A, B, F1, แบบผังบริเวณ (No.A0.06-A0.09.1), ตารางประตูหน้าต่าง และตารางรายการวัสดุผิวสำเร็จ		
4	17/04/2020	SI.1909.200407.CES.KY.#1(ARC-007)	ขอนำส่งแบบแปลนการปรับลดงานท่ออิฐผนังจาก 2 เหลือ 1 ชั้น สำหรับอาคาร G1-G5 และ S1-S10 ตามที่ ACSI สรุปกับ Designer : A49		
5	17/04/2020	SI.1909.200407.CES.KY.#2(ARC-008)	ขอนำส่งแบบงานสถาปัตยกรรม Revision 3 สำหรับอาคาร V1-V4 จาก Designer : A49		
6	17/04/2020	SI.1909.200407.CES.KY.#3(ARC-009)	ขอนำส่งแบบงานสถาปัตยกรรม Revision 4 สำหรับ อาคาร A,B,G,S แบบผังบริเวณ (No.A0.07-A0.09.1) และรายการประกอบแบบ Revision 4 (ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563) จาก Designer : A49		RFV-CES/PAC/STR/002
7	17/04/2020	SI.1909.200423.CES.KY.#1(ARC-012)	ขอนำส่งแบบงานสถาปัตยกรรม Revision 5 สำหรับ อาคาร D,E1,G2,G3,G4,G5,H,M,S1-S10,T และรายการประกอบแบบ Revision 5 (ลงวันที่ 20 เมษายน 2563) จาก Designer : A49		
SI -STR					
ลำดับ	วันที่รับ	เลขที่เอกสาร	เรื่อง	เอกสารอ้างอิง	เลขที่ VO
1	03/09/2019	SI.1909.190903.CES.STA#1(STR-001)	แบบขยายฐานรากและตำแหน่ง Plate Bearing Test		RFV/CES/PAC/STR/001
2	07/10/2019	SI.1909.190924.CES.NN#1(STR-002)	งานรื้อถอนอาคาร 4,5,6		RFV/CES/PAC/STR/002
3	02/10/2020	SI.1909.190926.CES.STA.#1 (STR-003)	Structural Drawing For Construction		
4	01/10/2019	SI.1909.191001.CES.STA#1(STR-004)	แก้ไขฐานรากแต่ละอาคาร สำหรับโครงการ		RFV/CES/PAC/STR/003
5	26/10/2019	SI.1909.191026.CES.STA#1(STR-006)	แก้ไขฐานรากอาคาร G4,G5 บริเวณ Lift Pit สำหรับโครงการ Andaz Resort Pattaya	RFV/STR-030	
6	13/11/2019	SI.1909.191107.CES.STA#1(STR-007)	ปรับแก้ไขโครงสร้างอาคาร S6,S10 สำหรับโครงการ Andaz Resort Pattaya	RFV/STR-035	
7	13/11/2019	SI.1909.191107.CES.STA#2(STR-008)	ปรับแก้ไขโครงสร้างอาคาร S5,S8 สำหรับโครงการ Andaz Resort Pattaya	RFV/STR-036	
8	14/11/2019	SI.1909.191114.CES.STA#1(STR-009)	ปรับแก้ไขโครงสร้างอาคาร S1,S4,S9 สำหรับโครงการ Andaz Resort Pattaya	RFV/STR-037	
9	14/11/2019	SI.1909.191114.CES.STA#2(STR-010)	ปรับแก้ไขโครงสร้างอาคาร S2,S8,S10 สำหรับโครงการ Andaz Resort Pattaya	RFV/STR-038	
10	14/07/2020	SI.1909.191119.CES.STA.#1(STR-012)	ปรับแก้ไขโครงสร้าง Canopy เชื่อมอาคาร สำหรับโครงการ Andaz Resort Pattaya	RFV/STR-039	
11	27/11/2019	SI.1909.191114.CES.STA#1(STR-013)	ปรับแก้ไขโครงสร้างอาคาร D บ่อน้ำทิ้งน้ำ สำหรับโครงการ Andaz Resort Pattaya		
12	27/11/2020	SI.1909.191127.CES.STA.#2 (STR-014)	ปรับแก้แบบโครงสร้างอาคาร G2 สำหรับโครงการ Andaz Resort Pattaya		
13	21/07/2020	SI.1909.191129.CES.STA.#1(STR-015)	ปรับแก้แบบโครงสร้างอาคาร G3 สำหรับโครงการ Andaz Resort Pattaya		
14	04/12/2019	SI.1909.191204.CES.STA#1(STR-016)	ปรับแก้ไขโครงสร้างอาคาร E2 สำหรับโครงการ Andaz Resort Pattaya		
15	19/12/2019	SI.1909.191219.CES.STA#1(STR-018)	ปรับแก้ไขโครงสร้างอาคาร F2 สำหรับโครงการ Andaz Resort Pattaya		
16	19/12/2019	SI.1909.191219.CES.STA#2(STR-019)	ปรับแก้ไขโครงสร้างอาคาร T สำหรับโครงการ Andaz Resort Pattaya		
17	26/02/2020	SI.1909.200203.CES.STA.#2(STR-021)	ส่งแบบโครงสร้างSTR_DWG_FULL Package-REV& STR_DWG_Civil Work สำหรับโครงการ Andaz Resort Pattaya		
18	18/02/2020	SI.1909.200218.CES.STA#1(STR-022)	งานสลาย Pro Sum อาคาร Miner House โครงการ Andaz Resort Pattaya		RFV/CES/PAC/STR/004
19	18/02/2020	SI.1909.200218.CES.STA#2(STR-023)	งานสลาย Pro Sum อาคาร Heritage House โครงการ Andaz Resort Pattaya		RFV/CES/PAC/STR/006
20	17/04/2020	SI.1909.200316.CES.STA#1(STR-024)	ปรับแก้แบบโครงสร้างอาคาร D บ่อน้ำทิ้งน้ำ & Gutter Rev.03		
21	17/04/2020	SI.1909.200316.CES.STA#2(STR-025)	ปรับแก้แบบโครงสร้างอาคาร V1-V4 Rev.03		
22	17/04/2020	SI.1909.200316.CES.STA#3(STR-026)	ปรับแก้แบบโครงสร้างอาคาร E1. Rev.03		
23	28/09/2020	SI.1909.200825.CES.STA#1(STR-027 Rev.01)	งานแบบ Detail Sewage Sump REV.03 โครงการ Andaz Resort Pattaya		
24	31/08/2020	SI.1901.200721.CES.STA.#1(STR-035)	งานขนย้ายดินนอกโครงการ	LET/CES/PAC/006 Rev.01	RFV/CES/PAC/STR/007
25	31/08/2020	SI.1901.200721.CES.STA.#2(STR-036)	งานค้ำยันดินไม้ชั่วคราวข้างอาคาร V4	LET/CES/PAC/011	
26	17/09/2020	SI.1909.200824.CES.STA.#1(STR-030)	แบบโครงสร้างพื้นระเบียงด้านติดทะเลอาคาร D สำหรับโครงการ Andaz Resort Pattaya		
27	17/09/2020	SI.1909.200731.CES.STA.#2(STR-040)	งานเพิ่ม Retaining Wall ข้างอาคาร D สำหรับโครงการ Andaz Resort Pattaya	RFV/CES/PAC/HARD/009	

SAMMARY OF SUBMITTED REQUEST FOR APPROVAL , REQUEST FOR INFORMATION AND SDITE INTRUCTION

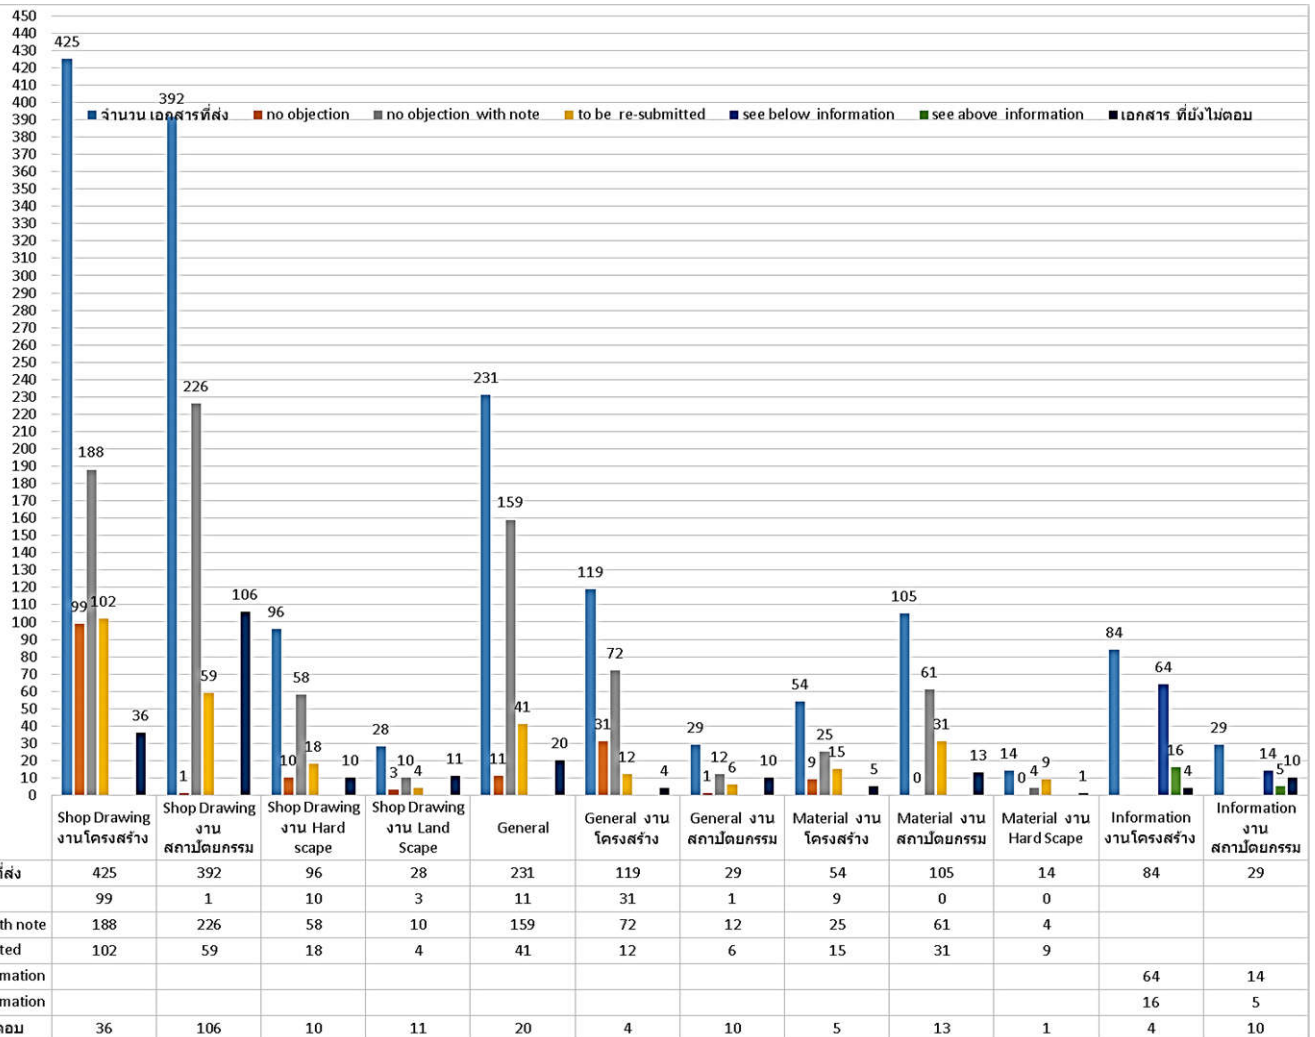



บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด อาคารสารสาสน์ ชั้น 10
90/22-25 ถนนสารสิน แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.: 02 636 7788 แฟกซ์: 02 636 7979
C.E.S. CO., LTD. SATHORN THANI BUILDING 10TH FLOOR
90/22-25 NORTH SATHORN ROAD, BANGRAK, BANGKOK 10500
www.ces.co.th


Minutes of Meeting

รายงานการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

โครงการ : ANDAZ RESORT PATTAYA
เรื่อง : ประชุมเทคนิคและความปลอดภัย ครั้งที่ 49
วัน/เวลา : วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานสนาม หน่วยงาน ANDAZ RESORT PATTAYA

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	บริษัท	E-mail	ลงนาม
1	คุณสันทาน สุดตา	บริษัท ศาลาแดง เฟลส จำกัด	santan@charterededsquare.com	
2	คุณทรงชัย บุญญพิชญกิจ	บริษัท ศาลาแดง เฟลส จำกัด	songchai@charterededsquare.com	
3	คุณชัยภูมิ สีเผือก	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	chaiyaphum@projectalliance.co.th	
4	คุณสุวรรณ เตชโยธา	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	suwan@projectalliance.co.th	
5	คุณเกียรติยศ ญาติพิมาย	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	Keattiyot@projectalliance.co.th	
6	คุณธีระศักดิ์ บุญเอื้อ	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	teerasak@projectalliance.co.th	
7	คุณอิรฟาน เจ๊ะมะ	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	erefan@projectalliance.co.th;	อิรฟาน.
8	คุณนคร นามแดง	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	nakorn@projectalliance.co.th	๕๖๓๕
9	คุณฉัตรนคร ขวัญเมือง	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	chatnakorn@projectalliance.co.th	
10	คุณอภิรัตน์ น้อยจันทร์	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	(apirat@projectalliance.co.th	
11	คุณธนตร พิริยพันธุ์พงศ์	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	thaneat@projectalliance.co.th	
12	คุณธีรศักดิ์ บุญเอื้อ	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	teerasak@projectalliance.co.th	
13	คุณธีระพงษ์ แก้วฉิมพลี	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	teerapong@projectalliance.co.th	
14	คุณวรพจน์ สีนสวัสดิ์	บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด	Ces.Andaz@ces.co.th	
15	คุณประภาพร บัวภา	บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด	Ces.Andaz@ces.co.th	ประภาพร
16	คุณศิริวัจน์ บุษยามลเศรษฐ์	บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด	Ces.Andaz@ces.co.th	
17	คุณธนศ นุตวงษ์	บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด	Ces.Andaz@ces.co.th	
18	คุณนเรศ สีนหนังสือ	บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด	Ces.Andaz@ces.co.th	
19	คุณสุนทร เกตุอุต์	บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด	Ces.Andaz@ces.co.th	
20	คุณภูวนาถ บุญรอด	บริษัท คิวทีซี กรุ๊ป จำกัด	qtc.andaz@qtc.co.th	
21	คุณรุ่งรัตน์ เสรีรัตน์ชัยพร	บริษัท คิวทีซี กรุ๊ป จำกัด	qtc.andaz@qtc.co.th	
22	คุณอภิญา มหะเสนีย์	บริษัท คิวทีซี กรุ๊ป จำกัด	qtc.andaz@qtc.co.th	
23	คุณสุพจน์ พรกิตติเจริญ	บริษัท คิวทีซี กรุ๊ป จำกัด	qtc.andaz@qtc.co.th	
24	คุณอรรณพ คล้ายสุวรรณ	บริษัท คิวทีซี กรุ๊ป จำกัด	qtc.andaz@qtc.co.th	
25	คุณภาณิสรา พลพันธุ์	บริษัท คิวทีซี กรุ๊ป จำกัด	qtc.andaz@qtc.co.th	
26	คุณวิศรุต อมฤตกุล	บริษัท คิวทีซี กรุ๊ป จำกัด	qtc.andaz@qtc.co.th	
27	คุณวีระวุฒิ นามเทพา	บริษัท คิวทีซี กรุ๊ป จำกัด	qtc.andaz@qtc.co.th	
28	คุณรักษโรจน์ จิตธนากรโกศล	บริษัท คิวทีซี กรุ๊ป จำกัด	qtc.andaz@qtc.co.th	



บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด อาคารสาราณีย์ ชั้น 10
90/22-25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.: 02 636 7788 แฟกซ์.: 02 636 7979
C.E.S. CO., LTD. SATHORN THANI BUILDING 10TH FLOOR
90/22-25 NORTH SATHORN ROAD, BANGRAK, BANGKOK 10500
www.ces.co.th

Minutes of Meeting รายงานการประชุม

29	คุณสรคม เกศมุกดา	บริษัท คิวทีซี กรุ๊ป จำกัด	qtc.andaz@qtc.co.th	
30	คุณอภิวัฒน์ กลิ่นประทุม	บริษัท คิวทีซี กรุ๊ป จำกัด	qtc.andaz@qtc.co.th	
31	คุณวินัย เวียงแก้ว	บริษัท คิวทีซี กรุ๊ป จำกัด	qtc.andaz@qtc.co.th	
32	คุณภูมิ อาบสุวรรณ	บริษัท คิวทีซี กรุ๊ป จำกัด	qtc.andaz@qtc.co.th	
33	คุณพิทยา ศาสตร์	บริษัท คิวทีซี กรุ๊ป จำกัด	qtc.andaz@qtc.co.th	
34	คุณวัชรินทร์ เยาวเรศ	บริษัท คิวทีซี กรุ๊ป จำกัด	qtc.andaz@qtc.co.th	
35	คุณสามารถ ด้านชาญชัย	บริษัท เอไอ เด็คคอเรชั่น จำกัด	Contact @aidecoration.com	
36	คุณศรารุณี พุทธิวัฒน์	บริษัท เอไอ เด็คคอเรชั่น จำกัด	Contact @aidecoration.com	

วิภากร งามศรีสมบูรณ์ KEEN
พิมพ์กร อิศรา อาริ
๑๓๔

Signature
