



your reliable alliance for projects



รายงานประจำเดือน ครั้งที่ 15

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567



สารบัญ

<u>บทที่</u>	<u>เรื่อง</u>	<u>หน้า</u>
1	บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	2-3
2	ข้อมูลโครงการ	4-6
3	การขออนุญาต	7-9
4	การออกแบบ	10-12
5	การจัดซื้อจัดจ้าง	13-15
6	การก่อสร้าง	16-17
7	การเงิน	18-19
	ภาคผนวก ก แผนงานโครงการ	20-24
	ภาคผนวก ข ภาพถ่ายโครงการ	25-32
	ภาคผนวก ค แผนผังโครงการ	33-34
	ภาคผนวก ง รายงานประจำวัน	35-279



1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร



1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ข้อมูลโครงการ (กรณารายละเอียดในบทที่ 2)

โครงการ Vehha (Condominiym At Huahin) เป็นอาคาร หุดพักอาศัยสูง 31 ชั้นไม่มีชั้นใต้ดิน 1 อาคารจำนวน ห้องพัก 365 ยูนิต

การขออนุญาต (กรณารายละเอียดในบทที่ 3)

ทางโครงการได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร(แบบ39ทวิ) ต่อทางสำนักงานเทศบาลหัวหิน ได้รับใบรับเรื่อง วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 หมดอายุวันที่ 29 มีนาคม 2568

การออกแบบ (กรณารายละเอียดในบทที่ 4)

แบบก่อสร้าง งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,งานภูมิสถาปัตย์,งานระบบประกอบอาคารและงานตกแต่งภายใน ทาง PAC ได้ส่งข้อมูลให้ทาง PB แล้ว

การจัดซื้อและจัดจ้าง (กรณารายละเอียดในบทที่ 5)

ทางโครงการได้ดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมางานเสาเข็มคือ บริษัท อีดีล ไทย เทอร์วี จำกัด แล้ว

ทางโครงการได้ดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมางาน โครงสร้างหลัก งานสถาปัตย์งานระบบประกอบอาคาร คือ บริษัท ฟรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) แล้ว

งานจัดซื้อจัดจ้างงาน งานตกแต่งภายใน และงานจัดจ้างอื่น ๆ เป็นไปตามลำดับในแผนงาน

การก่อสร้าง (กรณารายละเอียดในบทที่ 6)

งานก่อสร้างหลัก บริษัท ฟรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

การเงิน (กรณารายละเอียดในบทที่ 7)

การเงิน และงบประมาณดำเนินการงานเสาเข็มโดยบริษัท อีดีล ไทย เทอร์วี จำกัด ราคา 26,150,000 บาท

งานก่อสร้างหลัก บริษัท ฟรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ราคา 1,006,500,000 บาท

ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ เป็นไปตามลำดับในแผนงานอยู่ระหว่างการจัดทำงบประมาณ

ส่วนการบริหารต้นทุนช่วงก่อสร้างโดยบริษัท อัสทัส กรุ๊ป เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด



2. ข้อมูลโครงการ

ตัวอย่าง



2. ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป :

โครงการ Vehha (Condominiym At Huahin) เป็นอาคาร ชุดพักอาศัย สูง 31 ชั้น ไม่มีชั้นใต้ดิน 1 อาคารจำนวนห้องพัก 365 ยูนิต ตั้งอยู่หลัง สวนน้ำ วานานา หมู่บ้านหนองแก ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

เจ้าของโครงการ :

บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

ที่ปรึกษาออกแบบสถาปัตยกรรม :

บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด

ที่ปรึกษาออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง :

บริษัท อาร์คิเทค อีเอนจิเนียริ่ง 49 จำกัด

ที่ปรึกษาออกแบบงานระบบอาคาร :

บริษัท มิตร เทคโนโลยีคัลคอนซัลแตนท์ จำกัด

ที่ปรึกษางานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย :

บริษัท เอ-ไป่ วิศวกร จำกัด

ที่ปรึกษาออกแบบงานตกแต่งภายใน :

บริษัท เมคอะชีน จำกัด

ที่ปรึกษาออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม :

บริษัท แลนด์สเคปเทคโทนิคส์ จำกัด

ที่ปรึกษางานบริหารต้นทุน :

บริษัท อัลทัส กรุ๊ป เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษาบริหารควบคุมงานก่อสร้าง :

บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด

ผู้รับเหมางานเสาเข็ม :

บริษัท อิตัลไทย เทอร์วี จำกัด

ผู้รับเหมางานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม :

บริษัท ฟรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับเหมางานระบบอาคาร :

บริษัท ฟรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน :

หจก.บัวสุวรรณ อินทอนันท์ แอสโซซิเอท



ผู้รับเหมางานงานลิฟต์โดยสาร (สำนักงาน) :

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

งานอาคาร :

ออกแบบ



จัดซื้อ และจัดจ้าง



ก่อสร้าง



รายงานของช่วงเดือน : 1 มีนาคม 2567– 31 มีนาคม 2567

เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ

บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

ตัวอย่าง



3.การขออนุญาต

ตัวอย่าง



3. การขออนุญาต

ข้อ	ใบอนุญาต/อนุมัติ	หน่วยงาน	ต้องการ	ความคืบหน้า	สิ่งที่ต้องทำต่อไป
1	อนุมัติรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP)	-	PAC ได้รับสำเนารายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์	สำเนาให้ผู้รับเหมาหลักโครงการ
2	ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหลัก(39 ทวิ)	สำนักงานเทศบาลหัวหิน	-	PAC ได้สำเนาใบตง อนุญาต 39 ทวิ แล้ว หมดอายุ 29 มี.ค.68	สำเนาให้ผู้รับเหมาหลักโครงการ
3	ใบอนุญาตเชื่อมทางเข้าออกโครงการและเชื่อมท่อระบายน้ำสาธารณะ	สำนักงานเทศบาลหัวหิน	TBA	-	-
4	ใบอนุญาตเปิดใช้อาคาร (อ.6)	สำนักงานเทศบาลหัวหิน	TBA	-	-
5	ไฟฟ้าถาวร (มิเตอร์หลัก)	การไฟฟ้านครหลวง	TBA	-	-
6	ประปาถาวร	การประปานครหลวง	TBA	-	-
7	โทรศัพท์	TRCE/TOT/CAT	TBA	-	-
8	เลขที่อาคารและห้องชุดพักอาศัย	สำนักงานเทศบาลหัวหิน	TBA	-	-
9	กรรมสิทธิ์ห้องชุดพักอาศัย	สำนักงานที่ดิน	TBA	-	-

TBA = To be Advised (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

NA = Not Applicable (ไม่มี)



หมายเหตุ :

- ไม่มี

เรื่องคงค้างที่สำคัญ :

- ติดตามสัญญาของผู้รับเหมางานหลักจาก HSL

จำเป็นอย่าง



4.การออกแบบ

ตัวอย่าง



4.การออกแบบ

ข้อที่	งาน	กำหนด แล้วเสร็จ	%	สถานะ
1	แบบประกอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม แบบสถาปัตยกรรม แบบ โครงสร้าง แบบงานระบบ แบบภูมิสถาปัตยกรรม	- - - -	100 100 100 100	จบแล้ว จบแล้ว จบแล้ว จบแล้ว
2	แบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design) แบบสถาปัตยกรรม แบบ โครงสร้าง แบบงานระบบ แบบตกแต่งภายในห้องชุดพักอาศัย แบบตกแต่งภายในพื้นที่ส่วนกลาง แบบภูมิสถาปัตยกรรม แบบงานป้าย	- - - - - - -	100 100 100 100 100 100 100	จบแล้ว จบแล้ว จบแล้ว จบแล้ว จบแล้ว จบแล้ว จบแล้ว
3	แบบขออนุญาตก่อสร้าง แบบสถาปัตยกรรม แบบ โครงสร้าง แบบงานระบบประกอบอาคาร	- - -	100 100 100	จบแล้ว จบแล้ว จบแล้ว
4	แบบประมูลงาน แบบเสาเข็ม แบบ โครงสร้าง สถาปัตยกรรม และระบบ แบบตกแต่งภายในห้องชุดพักอาศัย แบบตกแต่งภายในพื้นที่ส่วนกลาง แบบภูมิทัศน์ตกแต่งสวน แบบงานป้ายอาคาร	- - - - - -	100 100 100 100 100 100	จบแล้ว จบแล้ว จบแล้ว จบแล้ว จบแล้ว จบแล้ว
5	แบบก่อสร้าง แบบเสาเข็ม แบบสถาปัตยกรรม แบบ โครงสร้าง แบบงานระบบ แบบตกแต่งภายในพื้นที่ส่วนกลาง	- - - - -	100 100 100 100 100	จบแล้ว จบแล้ว จบแล้ว จบแล้ว จบแล้ว



TBA = To be Advised (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

NA = Not Applicable (ไม่มี)

หมายเหตุ :

- NA

เรื่องคงค้างที่สำคัญ :

- NA

ตัวอย่าง



5.จัดซื้อจัดจ้าง

ตัวอย่าง



5. การจัดซื้อและจัดจ้าง

5.1 ที่ปรึกษา

ข้อที่	สัญญางาน	กำหนดตามแผนงาน	สถานะ
1	ออกแบบสถาปัตยกรรม	-	จบแล้ว
2	ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง	-	จบแล้ว
3	ที่ปรึกษางานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	-	จบแล้ว
4	ออกแบบวิศวกรรมระบบ	-	จบแล้ว
6	ออกแบบตกแต่งภายใน	-	จบแล้ว
7	ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม	-	จบแล้ว
8	ออกแบบงานด้านอะคูสติกส์	-	ไม่มี
9	ออกแบบป้ายอาคาร	-	ไม่มี
10	บริหารต้นทุน	-	จบแล้ว
11	บริหารควบคุมงานก่อสร้าง	-	จบแล้ว

5.2 ผู้รับจ้าง

ข้อที่	สัญญางาน	กำหนดตามแผนงาน	สถานะ
1	งานรื้อถอนอาคาร	NA	ไม่มี
2	งานเสาเข็มอาคาร	-	จบแล้ว
3	งานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม	-	จบแล้ว
4	งานระบบอาคาร	-	จบแล้ว
5	งานลิฟต์โดยสาร	-	จบแล้ว
6	งานตกแต่งภายในอาคาร (ห้องชุด)	-	จบแล้ว
7	งานตกแต่งภายในอาคาร (ส่วนกลาง)	-	จบแล้ว
8	งานภูมิทัศน์ตกแต่งสวน	29/02/24	รอประมาณงาน
9	งานป้ายอาคาร	15/06/24	รอประมาณงาน
10	ผู้จัดหางานเครื่องปรับอากาศ	-	จบแล้ว
11	Loose Furniture Public & Unit Area	25/03/24	รอประมาณงาน
12	ระบบ IT (Internet Service Provider)	TBA	รอประมาณงาน
13	Decoration Lighting	TBA	รอประมาณงาน

TBA = To be Advised (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

NA = Not Applicable (ไม่มี)



หมายเหตุ :

- ไม่มี

เรื่องคงค้างที่สำคัญ :

- ไม่มี

ตัวอย่าง



6.การก่อสร้าง

ตัวอย่าง



6. การก่อสร้าง

ผู้รับเหมางานเสาเข็ม บริษัท อิตัลไทย เทอร์วิ จำกัด

- งานก่อสร้าง (Construction works) แล้วเสร็จ 100%

ผู้รับเหมางานหลัก บริษัท พรินิลท์ จำกัด (มหาชน)

- งานเตรียมการ (Mobilization plan) แล้วเสร็จ 100 %
- งานระบบป้องกันดินพัง แล้วเสร็จ 100 %
- งานฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
- งานเสาและผนังชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 100 % งานฉาบผนังชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 90 %
- งานโครงสร้างพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 % งานก่อผนังชั้น 1 แล้วเสร็จ 60 %
- งานโครงสร้างพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ 100 %
- งานโครงสร้างพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จ 100 %
- งานโครงสร้างพื้นชั้น 4 แล้วเสร็จ 100 %
- งานโครงสร้างพื้นชั้น 5 แล้วเสร็จ 100 %
- งานโครงสร้างพื้นชั้น 6 แล้วเสร็จ 100%
- งานโครงสร้างพื้นชั้น 7 แล้วเสร็จ 100%
- งานโครงสร้างพื้นชั้น 8 แล้วเสร็จ 100% งานก่อผนังชั้น 8 แล้วเสร็จ 30 %
- งานโครงสร้างพื้นชั้น 9 แล้วเสร็จ 100%
- งานโครงสร้างพื้นชั้น 10 แล้วเสร็จ 100%
- งานโครงสร้างพื้นชั้น 11 แล้วเสร็จ 100%
- งานโครงสร้างพื้นชั้น 12 แล้วเสร็จ 100%
- งานโครงสร้างพื้นชั้น 13 แล้วเสร็จ 100%

การดำเนินงานก่อสร้างสรุปได้ดังนี้

ปัจจุบันงานโครงสร้าง ถึงพื้นชั้น 13 แล้วเสร็จ 100 % ,งานก่อผนังอยู่ที่ชั้น 8 ความก้าวหน้าเทียบกับแผนงานหลัก

Plan = 32.95 % , Actual = 33.97 % Ahead = + 9 วัน

Project Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

Update 31 MARCH 2024




ITEM	DESCRIPTIONS	Percent Weight (%)	Progress (%)	Percent Actual (%)
1	Bored Pile	4.00	100	4.00
2	Structural Works	27.00	65.5	17.19
3	Architectural Works	23.00	2.91	0.66
4	External & HardScape Works +SoftScape Works	4.00	-	-
5	Unit Room : Interior Works	20.50	-	-
6	Public Areas : Interior Works	2.00	-	-
7	M EP Works	2.00	2.91	0.49
8	IT System (Fiber,Hardware,Software)	0.50		
	Sum	100.00		22.34

S-CURVE

Schedule S-Curve,Cash Flow (แผนงานก่อสร้าง 26 เดือน) Revised 0.

PROJECT : VEHHA HUA-HIN

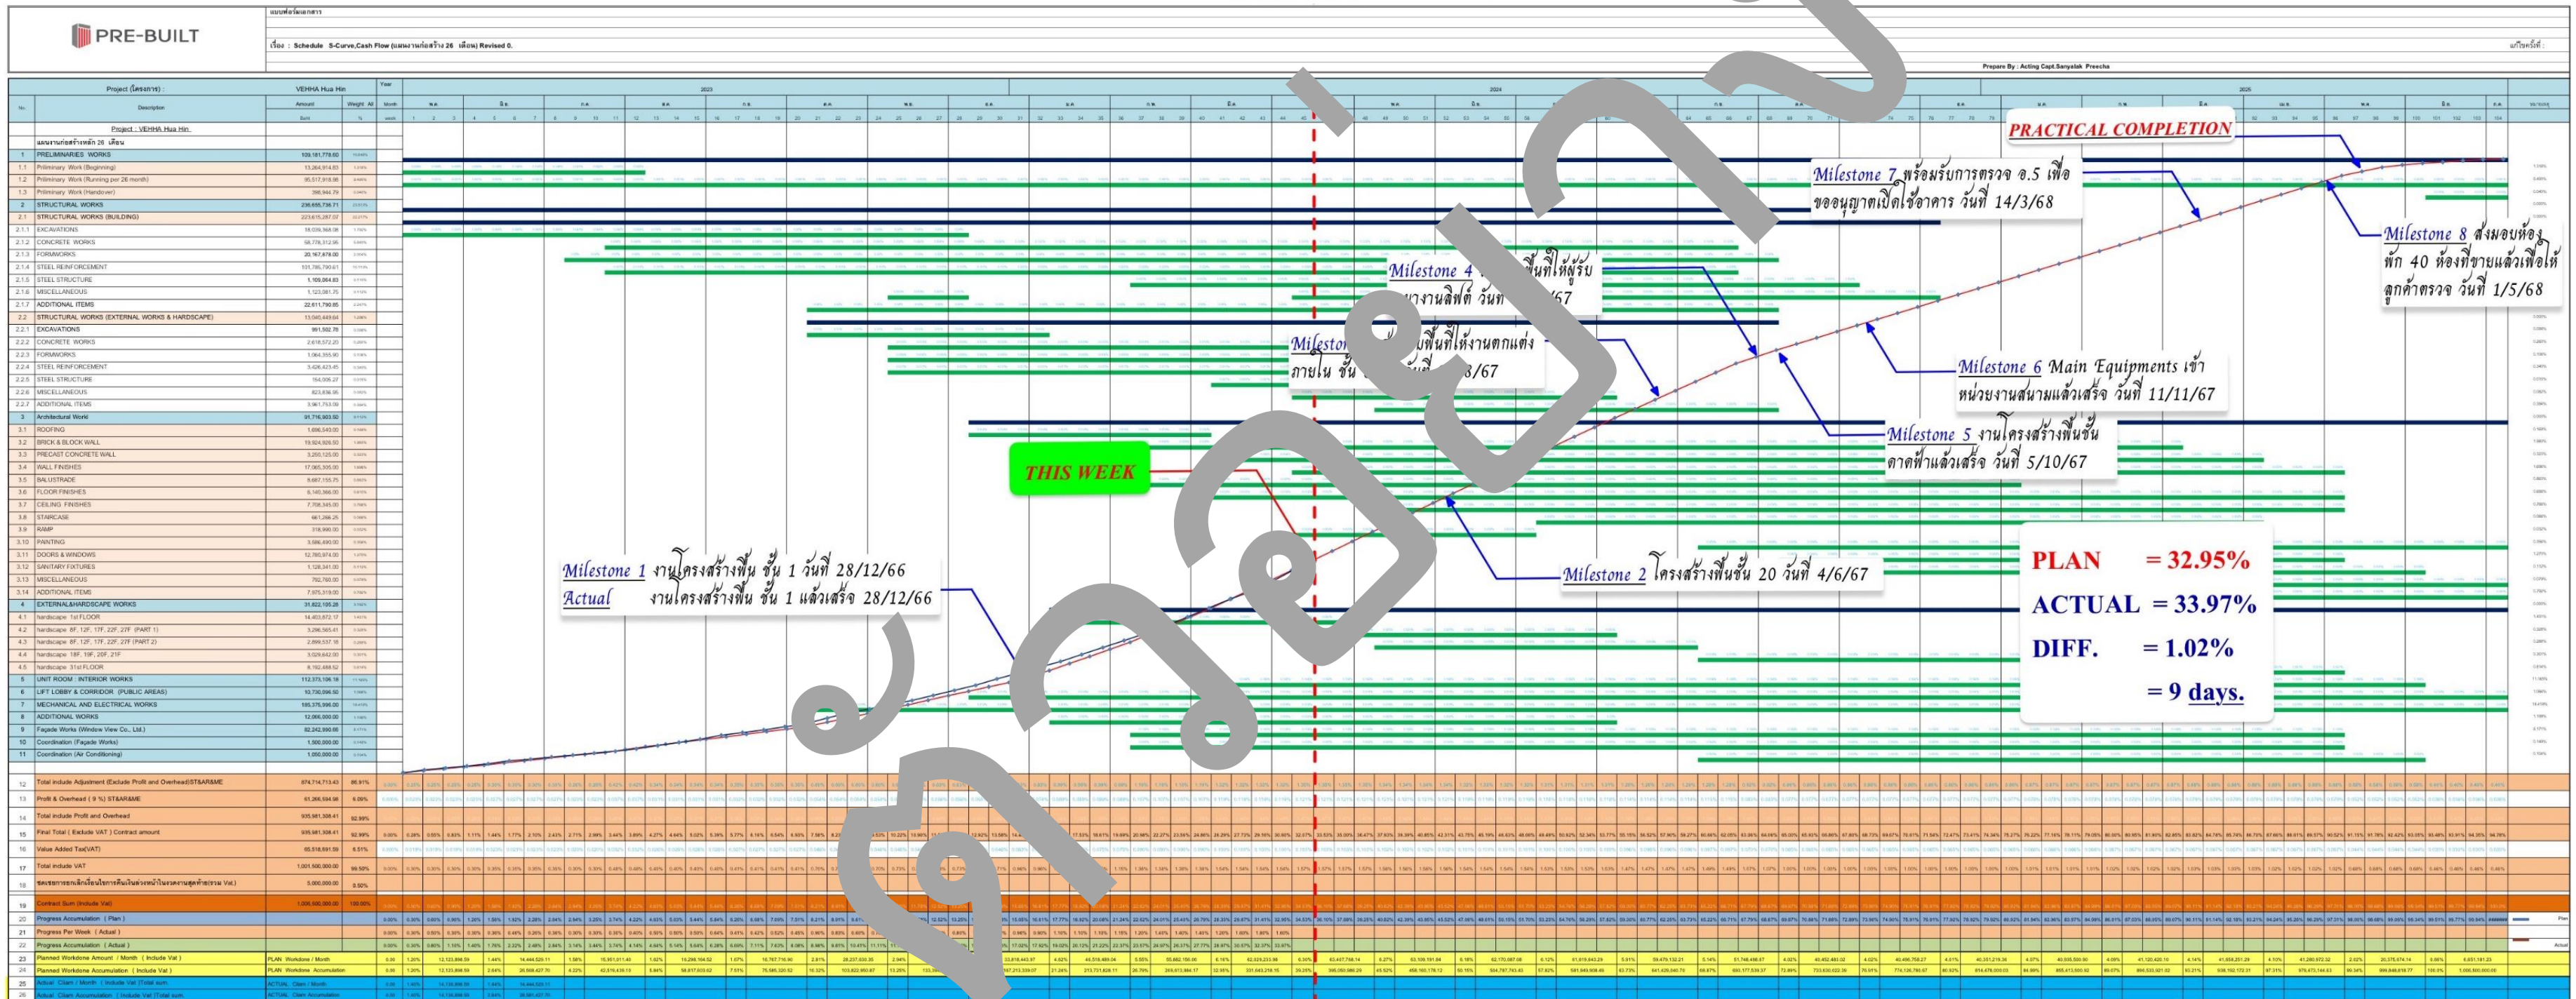

ACTION PLAN

ACTION PLAN

PROJECT VEHHA HUA-HIN

[illegible]



7.การเงิน

ตัวอย่าง



7. การเงิน

การเงิน และงบประมาณดำเนินการโดย บริษัท อัสทัส กรุ๊ป เซอร์วิสเชส (ประเทศไทยจำกัด) งบประมาณงานก่อสร้างหลักมูลค่า 1,006,500,000 บาท ส่วนช่วงก่อสร้างดำเนินการโดยบริษัทโปรเจ็คแอลไอเอ็นซ์ จำกัด (PAC)

สรุปสถานะ เบิกงวดงานผู้รับเหมา

Item	Descriptions	Progress (%)	Amount (including vat)
1.	Advance Paymant	10	100,650,000 บาท
2.	งวดที่ 1	3.27	32,944,586 บาท
3.	งวดที่ 2	3.94	39,670,471 บาท
4.	งวดที่ 3	1.78	17,929,740 บาท
5.	งวดที่ 4	1.78	17,940,944 บาท
6.	งวดที่ 5	2.59	26,048,134 บาท
7.	งวดที่ 6	2.06	20,705,386 บาท
8.	งวดที่ 7	2.59	36,180,953.87 บาท
9.	งวดที่ 8	3.80	38,197,895.08 บาท
	รวม	38.81	229,618,113.22 บาท


มูลค่าขออนุมัติรวม 1,006,500,000 บาท





ภาคผนวก ก แผนงาน โครงงาน

ตัวอย่าง



Project: PB Master Schedule VEHHA HUA HIN 13-06-23 Split Milestone	Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Manual Progress	
	Split Milestone		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline			
	Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Progress			



VEHHA HUAHIN MASTER SCHEDULE



วันที่ 13 มิถุนายน 2566

Task ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2023												2024												2025						
							Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul			
64		Level 3 FI	10 days	10/1/2024	20/1/2024	53SS+7 days																															
80		Level 4 FI	10 days	18/1/2024	29/1/2024	64SS+7 days																															
96		Level 5 FI	10 days	26/1/2024	6/2/2024	80SS+7 days																															
111		Level 6 FI	10 days	3/2/2024	14/2/2024	96SS+7 days																															
124		Level 7 FI	10 days	12/2/2024	22/2/2024	111SS+7 days																															
137		Level 8 FI	10 days	20/2/2024	2/3/2024	124SS+7 days																															
152		Level 9FI	10 days	28/2/2024	9/3/2024	137SS+6 days																															
167		Level 10 FI	10 days	6/3/2024	16/3/2024	152SS+6 days																															
182		Level 11 FI	10 days	13/3/2024	23/3/2024	167SS+6 days																															
198		Level 12 FI	10 days	20/3/2024	30/3/2024	182SS+6 days																															
213		Level 13 FI	10 days	27/3/2024	8/4/2024	198SS+6 days																															
228		Level 14 FI	10 days	3/4/2024	18/4/2024	213SS+6 days																															
243		Level 15 FI	10 days	11/4/2024	25/4/2024	228SS+6 days																															
258		Level 16 FI	10 days	22/4/2024	3/5/2024	243SS+6 days																															
273		Level 17 FI	10 days	29/4/2024	11/5/2024	258SS+6 days																															
288		Level 18 FI	10 days	8/5/2024	18/5/2024	273SS+6 days																															
303		Level 19 FI	10 days	15/5/2024	27/5/2024	288SS+6 days																															
318		Level 20 FI	10 days	23/5/2024	4/6/2024	303SS+6 days																															
333		Level 21 FI	10 days	30/5/2024	11/6/2024	318SS+6 days																															
348		Level 22 FI	10 days	7/6/2024	18/6/2024	333SS+6 days																															
363		Level 23 FI	10 days	14/6/2024	25/6/2024	348SS+6 days																															
378		Level 24 FI	10 days	21/6/2024	2/7/2024	363SS+6 days																															
393		Level 25 FI	10 days	28/6/2024	9/7/2024	378SS+6 days																															
408		Level 26 FI	10 days	5/7/2024	16/7/2024	393SS+6 days																															
423		Level 27 FI	10 days	12/7/2024	24/7/2024	408SS+6 days																															
438		Level 28 FI	10 days	23/7/2024	3/8/2024	423FS-2 days																															
445		Level 29 FI	10 days	2/8/2024	14/8/2024	438FS-2 days																															
452		Level 30 FI	10 days	13/8/2024	23/8/2024	445FS-2 days																															
459		Level 31 FI	10 days	24/8/2024	4/9/2024	452																															
466		Level Roof FI	10 days	5/9/2024	16/9/2024	459																															
473		Level MEP FI	5 days	17/9/2024	21/9/2024	466																															
477		Level Top Roof FI	7 days	23/9/2024	30/9/2024	473																															
482		ARCHITECTURE	297 days	6/3/2024	6/3/2025																																
483		Level 1 FI	150 days	5/8/2024	3/2/2025	490SS+120 days																															
484		Level 2 FI	90 days	23/5/2024	9/9/2024	490SS+60 days																															
485		Level 3 FI	90 days	11/6/2024	26/9/2024	484SS+15 days																															
486		Level 4 FI	90 days	28/6/2024	18/9/2024	485SS+15 days																															
487		Level 5 FI	90 days	16/7/2024	11/10/2024	486SS+15 days																															
488		Level 6 FI	90 days	5/8/2024	20/11/2024	487SS+15 days																															
489		Level 7 FI	90 days	23/8/2024	9/12/2024	488SS+15 days																															
490		Level 8 FI เริ่มส่งมอบพื้นที่หลังแล้วเสร็จให้ งานตกแต่งภายใน	110 days	6/3/2024	22/7/2024	489SS+15 days																															
502		Level 9 FI	110 days	22/3/2024	8/8/2024	490SS+14 days																															
503		Level 10 FI	110 days	30/3/2024	17/8/2024	502SS+14 days																															
504		Level 11 FI ส่งมอบพื้นที่ชุดแรกชั้น 8-11 ให้แก่ ID Contractor	110 days	9/4/2024	26/8/2024	503SS+14 days																															
505		Level 12 FI	110 days	18/5/2024	28/9/2024	504SS+29 days																															
506		Level 13 FI	110 days	28/5/2024	7/10/2024	505SS+7 days																															
507		Level 14 FI	110 days	6/6/2024	16/10/2024	506SS+7 days																															
508		Level 15 FI	110 days	14/6/2024	25/10/2024	507SS+7 days																															
509		Level 16 FI	110 days	22/6/2024	2/11/2024	508SS+7 days																															
510		Level 17 FI	110 days	1/7/2024	11/11/2024	509SS+7 days																															
511		Level 18 FI	110 days	9/7/2024	19/11/2024	510SS+7 days																															
512		Level 19 FI	110 days	19/7/2024	29/11/2024	511SS+9 days																															
513		Level 20 FI	110 days	30/7/2024	9/12/2024	512SS+7 days																															

Project: PB Master Schedule VEHHA HUA HIN 13-06-23 เพิ่ม MS สิ่งหึ่งพัก 40 ห้อง

Task

Summary

Split

Milestone

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Manual Progress



VEHHA HUAHIN MASTER SCHEDULE



วันที่ 13 มิถุนายน 2566

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2023												2024												2025						
							Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul			
514		Level 21FI	110 days	7/8/2024	18/12/2024	513SS+7 days																															
515		Level 22 FI	110 days	16/8/2024	26/12/2024	514SS+7 days																															
516		Level 23 FI	110 days	24/8/2024	6/1/2025	515SS+7 days																															
517		Level 24 FI	110 days	2/9/2024	14/1/2025	516SS+7 days																															
518		Level 25 FI	110 days	10/9/2024	22/1/2025	517SS+7 days																															
519		Level 26 FI	110 days	20/9/2024	1/2/2025	518SS+9 days																															
520		Level 27 FI	110 days	28/9/2024	10/2/2025	519SS+7 days																															
521		Level 28 FI	110 days	7/10/2024	18/2/2025	520SS+7 days																															
522		Level 29 FI	110 days	16/10/2024	26/2/2025	521SS+7 days																															
523		Level 30 FI	110 days	25/10/2024	6/3/2025	522SS+7 days																															
524	Level 31 FI	110 days	25/10/2024	6/3/2025	523SS																																
525	Level Roof FI	60 days	18/11/2024	30/1/2025	524SS+20 days																																
526	Level Roof FI	60 days	13/12/2024	22/2/2025	525SS+20 days																																
527		Other Works	120 days	19/10/2024	13/3/2025																																
528		Lift Installation	120 days	19/10/2024	13/3/2025	477FS+15 days																															
529		Main Equipment On Site	106 days	2/8/2024	7/12/2024																																
530		RMU	7 days	2/8/2024	9/8/2024																																
531		TR1&TR2	7 days	10/8/2024	19/8/2024	530																															
532		MDB1&MDB2&EMDB	10 days	20/8/2024	30/8/2024	531																															
533		Generator	15 days	31/8/2024	17/9/2024	532																															
534		FCP	7 days	29/11/2024	7/12/2024	537FS+15 days																															
535		Booster Pump	10 days	18/9/2024	28/9/2024	533																															
536		FP&JP	10 days	30/9/2024	10/10/2024	535																															
537		Pressurized Fan	10 days	31/10/2024	11/11/2024	536FS+15 days																															
538		External Works	360 days	29/12/2023	14/3/2025																																
539		WWTP	60 days	29/12/2023	9/3/2024	50																															
540		Drainage Works	60 days	5/9/2024	15/11/2024	459																															
541		Fence Works	60 days	23/9/2024	3/12/2024	540SS+15 days																															
542		Road Works	60 days	30/10/2024	11/1/2025	541SS+30 days																															
543		Hardscape Works	60 days	16/11/2024	29/1/2025	542SS+15 days																															
544		Landscape Works	60 days	4/1/2025	14/3/2025	543SS+38 days																															
545		Practical Completion	120 days	24/12/2024	14/5/2025	524FF+14 days																															
546		Final Completion	52 days	15/5/2025	14/7/2025	545FF+32 days																															





ภาคผนวก ข ภาพถ่ายโครงกระดูก

ตัวอย่าง

รูปถ่ายโครงการ เดือน มีนาคม 2567



ภาพมุมสูงโครงการ



ภาพรวมงานโครงสร้าง



ภาพรวมงานโครงสร้าง




ภาพรวมงานโครงสร้าง


รูปถ่ายโครงการ เดือน มีนาคม 2567



งานวางสลึง Post-Tension

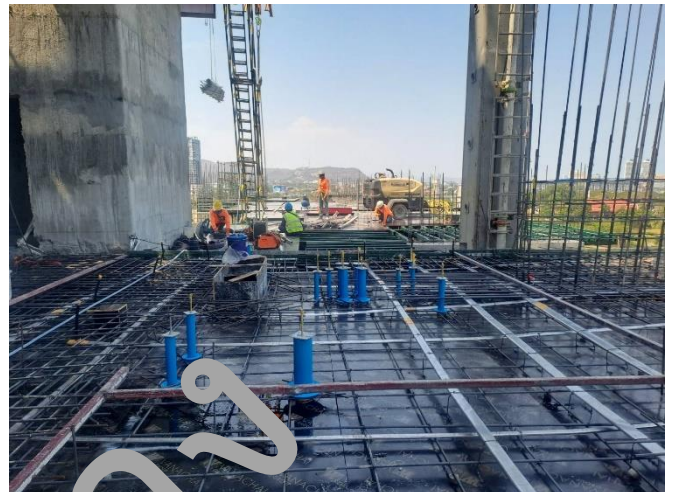

งานวางสลึง Post-Tension

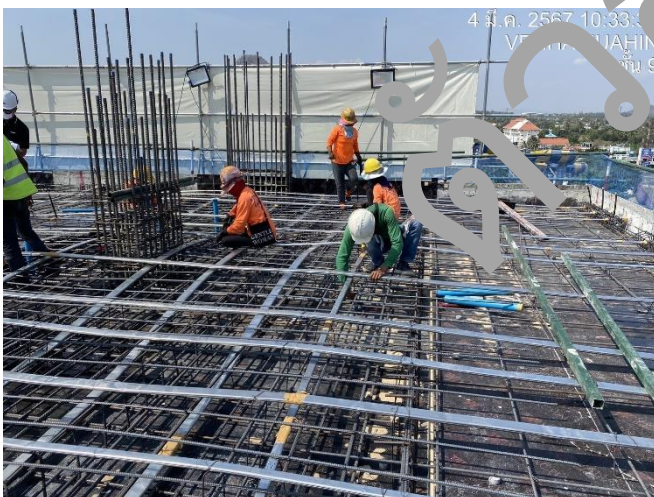

งานวางสลึง Post-Tension



งานวางสลึง Post-Tension

รูปถ่ายโครงการ เดือน มีนาคม 2567



งานเข้าแบบเสา



งานเข้าแบบเสา



งานเข้าแบบเสา



งานเข้าแบบเสา

รูปถ่ายโครงการ เดือน มีนาคม 2567



งานโครงสร้างบันได



งานโครงสร้างบันได




งานโครงสร้างบันได




งานโครงสร้างบันได

รูปถ่ายโครงการ เดือน มีนาคม 2567

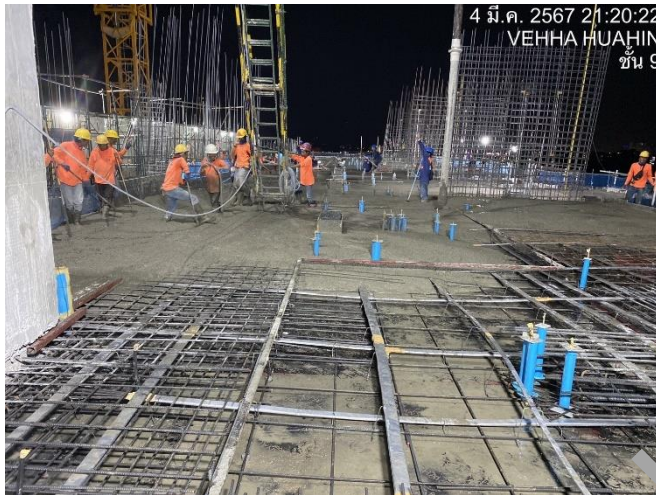

งานเทคอนกรีตพื้น Post-Tension

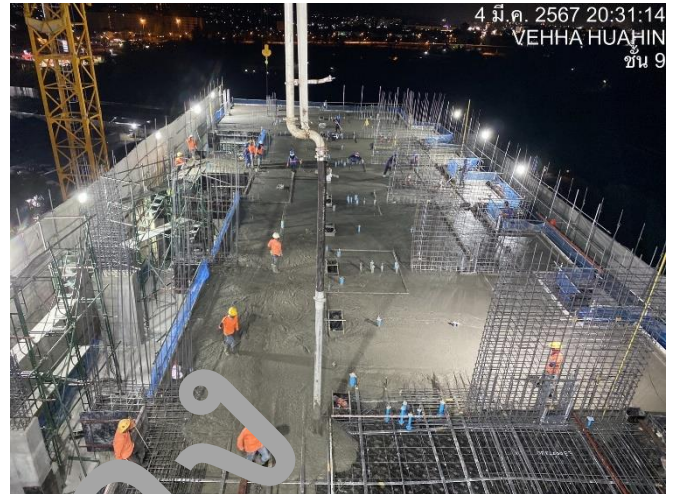

งานเทคอนกรีตพื้น Post-Tension



งานเทคอนกรีตพื้น Post-Tension



งานเทคอนกรีตพื้น Post-Tension


รูปถ่ายโครงการ เดือน มีนาคม 2567



งานติดตั้งสปิงเกอร์ที่จอดรถ



งานสทิมอาคารจอดรถ

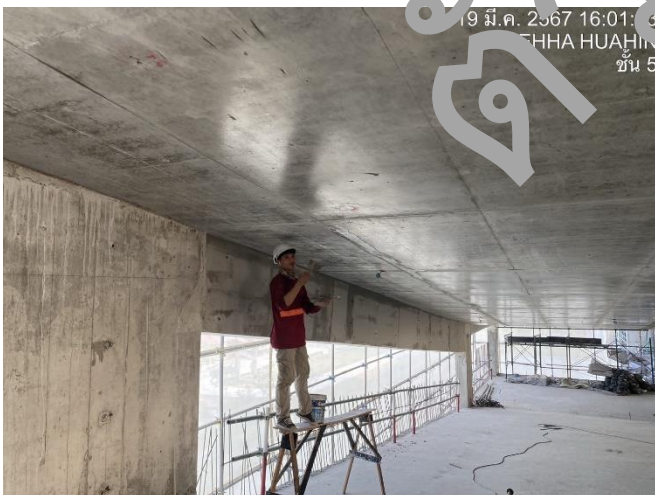

งานสทิมอาคารจอดรถ



งานสทิมอาคารจอดรถ

รูปถ่ายโครงการ เดือน มีนาคม 2567



งานก่อผนังชั้น 8



งานก่อผนังชั้น 1



งานก่อผนังชั้น 1



งานก่อผนังชั้น 8



ภาคผนวก ค แผนผังโครงการ

ตัวอย่าง

คาคำนวณงานสถาปัตยกรรม

ลำดับ	รายละเอียด	Master Schedule		Action Plan		Actual		DIFF
		Start	Finish	Start	Finish	Start	Finish	
1	งานก่ออิฐ ชั้น Basement	1 มี.ค. 67	15 มี.ค. 67	1 มี.ค. 67	15 มี.ค. 67	20 มี.ค. 67	5 มี.ค. 67	10
2	งานก่ออิฐ ชั้น 1	26 มี.ค. 67	9 เม.ย. 67	12 มี.ค. 67	26 มี.ค. 67	18 มี.ค. 67	18 มี.ค. 67	22
3	งานก่ออิฐ ชั้น 8	26 มี.ค. 67	9 เม.ย. 67	27 มี.ค. 67	10 เม.ย. 67	24 มี.ค. 67		2
4	งานก่ออิฐ ชั้น 9	5 เม.ย. 67	19 เม.ย. 67	6 เม.ย. 67	20 เม.ย. 67	28 มี.ค. 67		8
5	งานก่ออิฐ ชั้น 10	17 เม.ย. 67	1 พ.ค. 67	17 เม.ย. 67	1 พ.ค. 67			0
6	งานก่ออิฐ ชั้น 11	29 เม.ย. 67	13 พ.ค. 67	27 เม.ย. 67	11 พ.ค. 67			2
7	งานก่ออิฐ ชั้น 12	11 พ.ค. 67	25 พ.ค. 67	11 พ.ค. 67	25 พ.ค. 67			4
8	งานฉาบปูน ชั้น Basement	30 มี.ค. 67	13 เม.ย. 67	4 มี.ค. 67	18 มี.ค. 67			26
9	งานฉาบปูน ชั้น 1	13 พ.ค. 67	27 พ.ค. 67	29 เม.ย. 67	13 พ.ค. 67			14
10	งานฉาบปูน ชั้น 8	13 พ.ค. 67	27 พ.ค. 67	1 พ.ค. 67	1 พ.ค. 67			26
11	งานฉาบปูน ชั้น 9	23 พ.ค. 67	6 เม.ย. 67	21 เม.ย. 67	5 พ.ค. 67			32
12	งานฉาบปูน ชั้น 10	4 มิ.ย. 67	18 มิ.ย. 67	2 พ.ค. 67	16 พ.ค. 67			33
13	งานฉาบปูน ชั้น 11	16 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67	12 พ.ค. 67	26 พ.ค. 67			35
14	งานฉาบปูน ชั้น 12	28 มิ.ย. 67	12 ก.ค. 67	22 พ.ค. 67	5 มิ.ย. 67			37
เฉลี่ย(วัน)								18





ภาคผนวก ง รายงานประจำปี

ตัวอย่าง




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 1 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240302.HSL.AKH.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การรับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 4 แผ่น (หน้า 1/7)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 185 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ช่างเทคนิค			
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ชุรการ	1		
3. Safety	-	10. ช่างไม้	-		
4. สถาปนิก / วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน			
5. ผู้ควบคุมงาน	7	12. พนักงาน	86		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. แม่บ้าน	2		
7. ช่างเขียนแบบ	3	14. อื่นๆ	2		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			แนวทางการแก้ไข		
1. Tower Crane	2	4. Generator	-		
2. Backhoe	-	5. Mobile Crane	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Backhoe	-		
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด			ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		
ลายเซ็น :			ลายเซ็น :		
ชื่อ :	คุณอชิรมา ชันชะริตร		ชื่อ :	คุณวุฒิเลิศ ทองดี	
วันที่ :	02/03/67		วันที่ :	02/03/67	
ข้อเสนอแนะ :			ข้อเสนอแนะ :		
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 1 มีนาคม 2567

เรียน : คุณจิรัฏฐ์ สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240302.HSL.AKH.1

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/7)

[illegible]



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/7)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน




งานตรวจระยะชั้น ชั้น 9



งานผูกเหล็กเสาชั้น 9



งานเทเสาคอนกรีต ชั้น 9

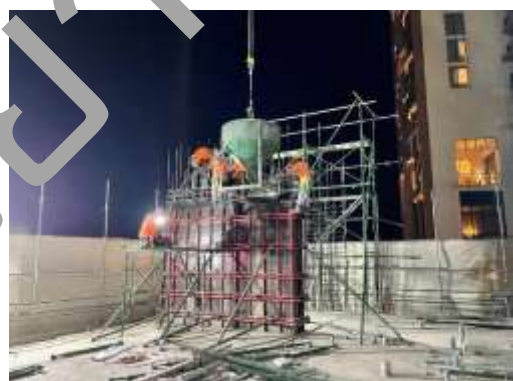

งานเทเสาคอนกรีตชั้น 9



งานปูพื้นไม้ ชั้น 9



งานก่ออิฐชั้น ใต้ดิน




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 2 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240304.HSL.AKH.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การรับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 4 แผ่น (หน้า 1/7)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 185 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ช่างเทคนิค			
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ชุกรการ	1		
3. Safety	-	10. ช่างไม้	-		
4. สถาปนิก / วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน			
5. ผู้ควบคุมงาน	7	12. ช่างงาน	86		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. แม่บ้าน	2		
7. ช่างเขียนแบบ	3	14. อื่นๆ	2		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			แนวทางการแก้ไข		
1. Tower Crane	2	4. Generator	-		
2. Backhoe	-	5. Mobile Crane	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Backhoe	-		
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด			ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		
ลายเซ็น :			ลายเซ็น :		
ชื่อ : คุณอชิรมา ชันชะริตร			ชื่อ : คุณวุฒิเลิศ ทองดี		
วันที่ : 04/03/67			วันที่ : 04/03/67		
ข้อเสนอแนะ			ข้อเสนอแนะ		
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____				เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC	



โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

ถึง : บริษัท หั่วหิ้น สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 2 มีนาคม 2567

เรียน : คุณชิษฐ์ชัย สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240304.HSL.AKH.1

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/7)

GL.8-11/B-D	20คน	10
GL.1-8/C-D	36คน	10
	1	8



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/7)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน




งานตรวจเหล็ก ชั้น 9



งานตรวจคานเสาชั้น 9



งานตรวจคานเสา ชั้น 9

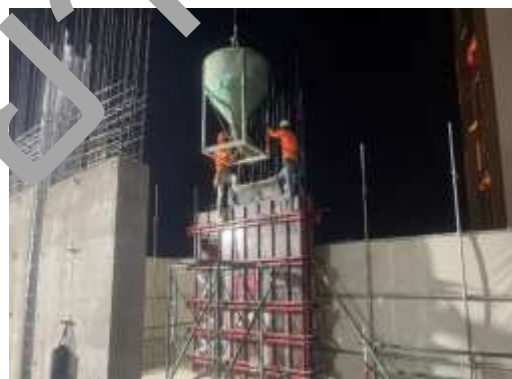

งานเทเสาคอนกรีตชั้น 9



งานปูพื้นไม้ ชั้น 9



งานแต่งผิวท้องพื้นโรงรถ



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 3 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240304.HSL.AKH.2
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การรับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 4 แผ่น (หน้า 1/4)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 185 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ช่างเทคนิค			
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ชุรการ	1		
3. Safety	-	10. ช่างไม้	-		
4. สถาปนิก / วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน			
5. ผู้ควบคุมงาน	7	12. พนักงาน	86		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. แม่บ้าน	2		
7. ช่างเขียนแบบ	3	14. อื่นๆ	2		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			แนวทางการแก้ไข		
1. Tower Crane	2	4. Generator	-		
2. Backhoe	-	5. Mobile Crane	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Backhoe	-		
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด			
ลายเซ็น :		ลายเซ็น :			
ชื่อ : คุณอชิรมา ชันชะริตร		ชื่อ : คุณวุฒิเลิศ ทองดี			
วันที่ : 04/03/67		วันที่ : 04/03/67			
ข้อเสนอแนะ : _____		ข้อเสนอแนะ : _____			
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/4)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานสลิฟพื้น ชั้น 9



งานสลิฟพื้นชั้น 9



งานลงเหล็กบน ชั้น 9



งานลงเหล็กบนชั้น 9



งานเก็บรายละเอียดก่อนเทพื้น ชั้น 9



งานเก็บรายละเอียดก่อนเทพื้นชั้น 9




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 4 มีนาคม 2567
 เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240305.HSL.NN.1
 อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
 การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
 เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
 (รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 11 แผ่น (หน้า 1/11)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายออกจัน (*) ห้ามข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 280 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการ โครงการ	- 8. ช่างสี	- ไม่มี			
2. วิศวกร โครงการ	1 9. ช่างการ		1		
3. Safety	2 10. ช่างไม้		28		
4. สถาปนิก / วิศวกร	5 11. ช่างฉาบปูน		9		
5. ผู้ควบคุมงาน	7 12. ช่างงาน		88		
6. หัวหน้าคนงาน	5 13. ช่างบ้าน		2		
7. ช่างเขียนแบบ	3 14. ช่างอื่น		20		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			แนวทางการแก้ไข		
1. Tower Crane	2 4. Generator	-			
2. Backhoe	- 5. Mobile Crane	-			
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	- 6. Backhoe	-			
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด				
ลายเซ็น : <u>ช.คร</u>	ลายเซ็น : <u>พ.จิณ</u>				
ชื่อ : คุณนคร นามแดง	ชื่อ : คุณวุฒิเลิศ ทองดี				
วันที่ : 05/03/67	วันที่ : 05/03/67				
ข้อเสนอแนะ : _____	ข้อเสนอแนะ : _____				
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



เอกสารแนบรายงานการทำงานประจำวัน

วันที่ทำงาน : 5 มีนาคม 2567

เลขที่ : DRP.2301.240305.HSL.NN.1

(หน้า 2/11)

Low tension Zone B ชั้น 10	GL.9-15/B-D	70 คน	100%
10	GL.11/B-D		0%
ลานจอดรถ	ชั้น 2-3	6 คน	50%
	ชั้นใต้ดิน	8 คน	60%




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/11)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน

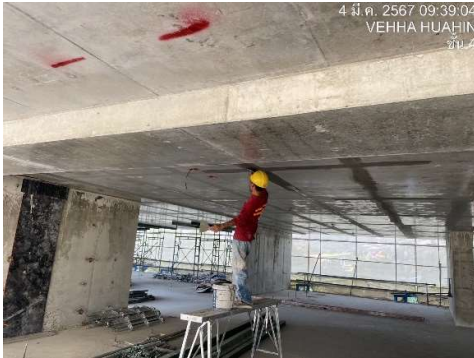


งานฉาบผิวบางถานจอตกรุด Zone A ชั้น 2-3



งานเทคอนกรีตบันได ST-02 ชั้น 5



งานเหล็กเสริมบันได ST-01 ชั้น 9

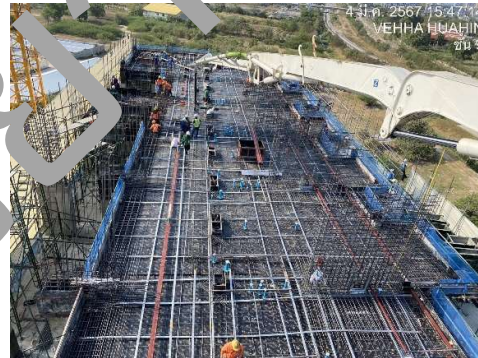

งานเหล็กเสริมพื้น Post tension Zone A ชั้น 9



งานเทคอนกรีตพื้น Post tension Zone A ชั้น 9



งานตรวจสอบเหล็กเสริมผนังลิฟต์ก่อนเทคอนกรีต ชั้น 10




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 5 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240306.HSL.NN.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 11 แผ่น (หน้า 1/11)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายออกจัน (*) ห้ามข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ			
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”							
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 307 คน)			ปัญหาและอุปสรรค					
1. ผู้จัดการโครงการ	1 8. ช่างสี 6	Tower Crane No.1 ชำรุด						
2. วิศวกรโครงการ	1 9. ช่างการ 1							
3. Safety	2 10. ช่างไม้ 24							
4. สถาปนิก / วิศวกร	5 11. ช่างฉาบปูน 9							
5. ผู้ควบคุมงาน	7 12. ช่างงาน 8							
6. หัวหน้าคนงาน	5 13. ช่างบ้าน 2	แนวทางการแก้ไข						
7. ช่างเขียนแบบ	3 14. ช่างอื่น 25	- ได้มีการดำเนินการแจ้งซ่อม และอยู่ระหว่างการซ่อมแซม						
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)								
1. Tower Crane	2 4. Generator -							
2. Backhoe	- 5. Mobile Crane -							
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	- 6. Backhoe -							
รายงานโดย :	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	ทบทวนโดย :	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด					
ลายเซ็น :	ช.คร	ลายเซ็น :	พ.จิณ					
ชื่อ :	คุณนคร นามแดง	ชื่อ :	คุณวุฒิเลิศ ทองดี					
วันที่ :	06/03/67	วันที่ :	06/03/67					
ข้อเสนอแนะ :		ข้อเสนอแนะ :						
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC					



โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

ถึง : บริษัท หั่วหิ้น สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 5 มีนาคม 2567

เรียน : คุณชิรัสย์ ธุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240306.HSL.NN.1

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/11)

ประเภทอาคาร	จำนวนพื้นที่ (ตารางเมตร)	จำนวนคน	เปอร์เซ็นต์ (%)
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 9	GL.2-8/B-D	70 คน	60%
T-01 ชั้น 9-10	GL.11/B-D	5 คน	10%
ชั้น 9	GL.8-11/D	1 คน	100%
ชั้น 11-12	GL.8-11/C-D	20 คน	100%
ลานจอดรถ	ชั้น 2-3	6 คน	50%
	ชั้น 1-12	8 คน	60%



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/11)


รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



การประชุมเทคนิคและความปลอดภัยประจำสัปดาห์



งานฉาบฉวย งานโครงสร้าง ชั้น 4

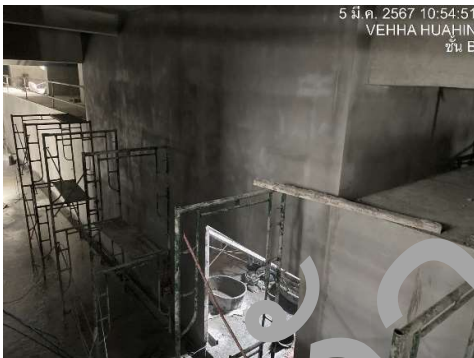


งานฉาบผนัง ชั้น 11



งานเทคอนกรีต Slipform ชั้น 11-12



งานไม้แบบพื้น Post tension Zone B ชั้น 10

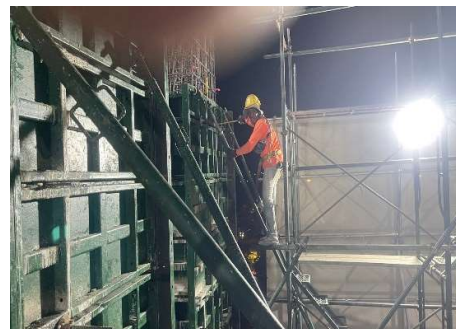

งานเทคอนกรีตเสา ชั้น 9




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 6 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240307.HSL.NN.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 13 แผ่น (หน้า 1/13)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 299 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1 8. ช่างสี 6	- ไม่มี			
2. วิศวกรโครงการ	1 9. ช่างการ 1				
3. Safety	2 10. ช่างไม้ 24				
4. สถาปนิก / วิศวกร	5 11. ช่างฉาบปูน 8				
5. ผู้ควบคุมงาน	7 12. ช่างปูน 8				
6. หัวหน้าคนงาน	5 13. ช่างปูน 2	แนวทางการแก้ไข			
7. ช่างเขียนแบบ	3 14. ช่างอื่น 27	- ไม่มี			
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Tower Crane	2 4. Generator -				
2. Backhoe	- 5. Mobile Crane -				
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	- 6. Backhoe -				
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด				
ลายเซ็น :	ลายเซ็น :				
ชื่อ : คุณนคร นามแดง	ชื่อ : คุณวุฒิเลิศ ทองดี				
วันที่ : 07/03/67	วันที่ : 07/03/67				
ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอแนะ				
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



เอกสารแนบรายงานการทำงานประจำวัน

วันที่ทำงาน : 6 มีนาคม 2567

เลขที่ : DRP.2301.240307.HSL.NN.1

(หน้า 2/13)

พร้อมเทคอนกรีต ชั้น 9	GL.2-7/B-D	65 คน	95%
9	GL.8-11/D	4 คน	10%
ชั้น 11-12	GL.8-11/C-D	1 คน	10%
ลานจอดรถ	ชั้น 2-3	6 คน	50%
	ชั้น 1-2	8 คน	70%



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/13)


รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานฉาบผิวบางลานจอดรถ ชั้น 3




งานฉาบผิวผนังใต้ดิน

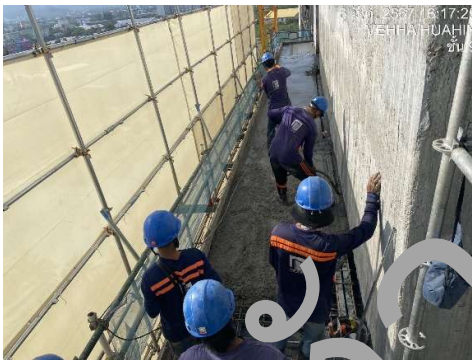

งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น 9



งานเทคอนกรีต Slipform ชั้น 11-12

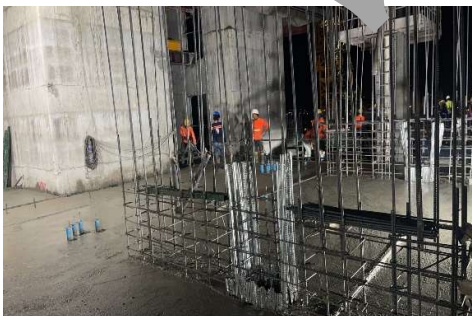

งานเทคอนกรีตพื้น Post tension Zone B ชั้น 10



งานเทคอนกรีตเสา ชั้น 9




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 7 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240308.HSL.NN.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 13 แผ่น (หน้า 1/13)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ห้ามข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 299 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1 8. ช่างสี 6	- ไม่มี			
2. วิศวกรโครงการ	1 9. ช่างการ 1				
3. Safety	2 10. ช่างไม้ 24				
4. สถาปนิก / วิศวกร	5 11. ช่างฉาบปูน 8				
5. ผู้ควบคุมงาน	7 12. ช่างปูน 8				
6. หัวหน้าคนงาน	5 13. ช่างปูน 2	แนวทางการแก้ไข			
7. ช่างเขียนแบบ	3 14. ช่างอื่น 27	- ไม่มี			
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Tower Crane	2 4. Generator -				
2. Backhoe	- 5. Mobile Crane -				
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	- 6. Backhoe -				
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด				
ลายเซ็น :	ลายเซ็น :				
ชื่อ : คุณนคร นามแดง	ชื่อ : คุณวุฒิเลิศ ทองดี				
วันที่ : 08/03/67	วันที่ : 07/03/67				
ข้อเสนอแนะ : _____	ข้อเสนอแนะ : _____				
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



เอกสารแนบรายงานการทำงานประจำวัน

วันที่ทำงาน : 7 มีนาคม 2567

เลขที่ : DRP.2301.240308.HSL.NN.1

(หน้า 2/13)

พร้อมเทคอนกรีต ชั้น 10-11	GL.2-7/B-D	65 คน	50%
ชั้น 10-11	GL.8-11/D	4 คน	10%
งานจ่อครก	ชั้น 2-3	6 คน	55%
	ชั้นใต้ดิน	8 คน	75%



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/13)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานฉาบผิวบางลานจอดรถ ชั้น 4



งานฉาบผิวบางลานจอดรถ ชั้น 8



งานฉาบผิวบางลานจอดรถ ชั้น 6



งานเทคอนกรีตเสา ชั้น 9



งานเหล็กเสริมเสา Zone B ชั้น 10



งานไม้แบบพื้น Zone A ชั้น 10




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 8 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240309.HSL.AKH.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การรับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 4 แผ่น (หน้า 1/5)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 197 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ช่างเทคนิค			
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ชูการ	1		
3. Safety	-	10. ช่างไม้	-		
4. สถาปนิก / วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน			
5. ผู้ควบคุมงาน	7	12. ช่างงาน	84		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. แม่บ้าน	2		
7. ช่างเขียนแบบ	3	14. อื่นๆ	2		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			แนวทางการแก้ไข		
1. Tower Crane	2	4. Generator	-		
2. Backhoe	-	5. Mobile Crane	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Backhoe	-		
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด			ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		
ลายเซ็น :			ลายเซ็น :		
ชื่อ :	คุณอชิรมา ชันชะริตร		ชื่อ :	คุณวุฒิเลิศ ทองดี	
วันที่ :	09/03/67		วันที่ :	09/03/67	
ข้อเสนอแนะ :			ข้อเสนอแนะ :		
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 8 มีนาคม 2567

เรียน : คุณจิรัฏฐ์ สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240309.HSL.AKH.1

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/5)

[illegible]



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/5)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานปูพื้นไม้ ชั้น 10



งานปูพื้นไม้ชั้น 10



งานเตรียมลงเหล็กบนชั้น 10



งานเตรียมลงเหล็กบนชั้น 10



งานเทเสา ชั้น 9



งานชั้นฉาบผนังเสาถาวรจอดชั้น 2



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หั่วหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 9 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240310.HSL.AKH.2
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การรับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 4 แผ่น (หน้า 1/5)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 197 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ช่างเทคนิค			
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ชุรการ	1		
3. Safety	-	10. ช่างไม้	-		
4. สถาปนิก / วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน			
5. ผู้ควบคุมงาน	7	12. พนักงาน	84		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. แม่บ้าน	2		
7. ช่างเขียนแบบ	3	14. อื่นๆ	2		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			แนวทางการแก้ไข		
1. Tower Crane	2	4. Generator	-		
2. Backhoe	-	5. Mobile Crane	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Backhoe	-		
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด			ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		
ลายเซ็น :			ลายเซ็น :		
ชื่อ :	คุณอชิรมา ชันชะริตร		ชื่อ :	คุณวุฒิเลิศ ทองดี	
วันที่ :	10/03/67		วันที่ :	10/03/67	
ข้อเสนอแนะ :			ข้อเสนอแนะ :		
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/5)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานปูพื้นไม้ ชั้น 10



งานลงเหล็กชั้น 10



งานเตรียมลงเหล็กบนชั้น 10



งานเตรียมลงเหล็กบนชั้น 10



งานลงสลิ้ง ชั้น 10



งานชั้นฉาบผนังเสาตอม่อชั้น 1




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 10 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240311.HSL.AKH.3
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การรับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 4 แผ่น (หน้า 1/5)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 197 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ช่างเทคนิค			
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ชุรการ	1		
3. Safety	-	10. ช่างไม้	-		
4. สถาปนิก / วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน			
5. ผู้ควบคุมงาน	7	12. พนักงาน	84		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. แม่บ้าน	2		
7. ช่างเขียนแบบ	3	14. อื่นๆ	2		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			แนวทางการแก้ไข		
1. Tower Crane	2	4. Generator	-		
2. Backhoe	-	5. Mobile Crane	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Backhoe	-		
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด			ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		
ลายเซ็น :			ลายเซ็น :		
ชื่อ :	คุณอชิรมา ชันชะริตร		ชื่อ :	คุณวุฒิเลิศ ทองดี	
วันที่ :	11/03/67		วันที่ :	11/03/67	
ข้อเสนอแนะ :			ข้อเสนอแนะ :		
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

ถึง : บริษัท หั่วหิ้น สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 10 มีนาคม 2567

เรียน : คุณชิษฐ์ชัย สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240311.HSL.AKH.3

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/5)

[illegible]



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/5)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานปูพื้นไม้ ชั้น 10



งานลงเหล็กชั้น 10



งานเตรียมลงเหล็กบนชั้น 10



งานเตรียมลงเหล็กบนชั้น 10



งานลงสลิ้ง ชั้น 10



งานชั้นฉาบผนังเสาตอม่อชั้น 1




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 11 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240314.HSL.AKH.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การรับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 4 แผ่น (หน้า 1/7)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 197 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ช่างเทคนิค			
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ชุรการ	1		
3. Safety	-	10. ช่างไม้	-		
4. สถาปนิก / วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน			
5. ผู้ควบคุมงาน	7	12. พนักงาน	84		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. แม่บ้าน	2		
7. ช่างเขียนแบบ	3	14. อื่นๆ	2		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			แนวทางการแก้ไข		
1. Tower Crane	2	4. Generator	-		
2. Backhoe	-	5. Mobile Crane	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Backhoe	-		
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด			ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		
ลายเซ็น :			ลายเซ็น :		
ชื่อ :	คุณอชิรมา ชันระริตร		ชื่อ :	คุณวุฒิเลิศ ทองดี	
วันที่ :	14/03/67		วันที่ :	14/03/67	
ข้อเสนอแนะ :			ข้อเสนอแนะ :		
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 11 มีนาคม 2567

เรียน : คุณชิษฐ์ชัย สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240314.HSL.AKH.1

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/5)

[illegible]



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/5)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานเตรียมเทพื้น ชั้น 10



งานเตรียมเทพื้นชั้น 10



งานเทคอนกรีต ชั้น 10



งานเทคอนกรีตชั้น 10



งานเทสลีฟฟอร์ม ชั้น 11-12



งานฉาบผนังเสาฉาบฉาบจอดรตชั้น 2




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 12 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240314.HSL.AKH.2
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การรับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 4 แผ่น (หน้า 1/7)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 197 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ช่างเทคนิค			
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ชูรการ	1		
3. Safety	-	10. ช่างไม้	-		
4. สถาปนิก / วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน			
5. ผู้ควบคุมงาน	7	12. พนักงาน	84		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. แม่บ้าน	2		
7. ช่างเขียนแบบ	3	14. อื่นๆ	2		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			แนวทางการแก้ไข		
1. Tower Crane	2	4. Generator	-		
2. Backhoe	-	5. Mobile Crane	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Backhoe	-		
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด			ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		
ลายเซ็น :			ลายเซ็น :		
ชื่อ : คุณอชิรมา ชันชะริตร			ชื่อ : คุณวุฒิเลิศ ทองดี		
วันที่ : 14/03/67			วันที่ : 14/03/67		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____				เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC	



โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 12 มีนาคม 2567

เรียน : คุณจิรัฏฐ์ สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240314.HSL.AKH.2

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/7)

[illegible]



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/7)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานเตรียมเทพื้น ชั้น 11



งานเตรียมเทพื้นชั้น 11



งานเทคอนกรีต ชั้น 11



งานเทคอนกรีตชั้น 11



งานเทคอนกรีต ชั้น 11



งานตรวจสอบก่อนฉาบผนังบันไดชั้น 2




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 13 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240314.HSL.AKH.3
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การรับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 4 แผ่น (หน้า 1/7)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 197 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ช่างเทคนิค			
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ชุรการ	1		
3. Safety	-	10. ช่างไม้	-		
4. สถาปนิก / วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน			
5. ผู้ควบคุมงาน	7	12. พนักงาน	84		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. แม่บ้าน	2		
7. ช่างเขียนแบบ	3	14. อื่นๆ	2		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			แนวทางการแก้ไข		
1. Tower Crane	2	4. Generator	-		
2. Backhoe	-	5. Mobile Crane	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Backhoe	-		
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด			ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		
ลายเซ็น :			ลายเซ็น :		
ชื่อ :	คุณอชิรมา ชันชะริตร		ชื่อ :	คุณวุฒิเลิศ ทองดี	
วันที่ :	14/03/67		วันที่ :	14/03/67	
ข้อเสนอแนะ :			ข้อเสนอแนะ :		
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 13 มีนาคม 2567

เรียน : คุณจิรัฏฐ์ สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240314.HSL.AKH.3

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/7)

[illegible]



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/7)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานเตรียมเสาเข็ม ชั้น 11



งานเสาเข็ม ชั้น 11



งานเสาเข็ม ชั้น 11



งานเสาเข็ม ชั้น 11



งานตรวจผนังลิฟท์ก่อนเท ชั้น 11-12



งานฉาบผนังบันไดชั้น 2




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 14 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240315.HSL.AKH.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การรับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 4 แผ่น (หน้า 1/7)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 197 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ช่างเทคนิค			
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ชุรการ	1		
3. Safety	-	10. ช่างไม้	-		
4. สถาปนิก / วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน			
5. ผู้ควบคุมงาน	7	12. พนักงาน	84		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. แม่บ้าน	2		
7. ช่างเขียนแบบ	3	14. อื่นๆ	2		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			แนวทางการแก้ไข		
1. Tower Crane	2	4. Generator	-		
2. Backhoe	-	5. Mobile Crane	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Backhoe	-		
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด			ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		
ลายเซ็น :			ลายเซ็น :		
ชื่อ :	คุณอชิรมา ชันชะริตร		ชื่อ :	คุณวุฒิเลิศ ทองดี	
วันที่ :	15/03/67		วันที่ :	15/03/67	
ข้อเสนอแนะ :			ข้อเสนอแนะ :		
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 14 มีนาคม 2567

เรียน : คุณจิรัฏฐ์ สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240315.HSL.AKH.1

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/7)

[illegible]



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/7)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานเทสลีฟฟอร์ม ชั้น 13-14



งานเทสลีฟ ริมชั้น 13-14



งานดิ่งเสา ชั้น 11



งานเทเสาชั้น 11



งานแต่งผิวท้องพื้นโรงรถ



งานก่ออิฐชั้นล่าง




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 15 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240316.HSL.AKH.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การรับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 4 แผ่น (หน้า 1/7)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 197 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ช่างเทคนิค			
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ชุรการ	1		
3. Safety	-	10. ช่างไม้	-		
4. สถาปนิก / วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน			
5. ผู้ควบคุมงาน	7	12. พนักงาน	84		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. แม่บ้าน	2		
7. ช่างเขียนแบบ	3	14. อื่นๆ	2		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			แนวทางการแก้ไข		
1. Tower Crane	2	4. Generator	-		
2. Backhoe	-	5. Mobile Crane	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Backhoe	-		
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด			ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		
ลายเซ็น :			ลายเซ็น :		
ชื่อ :	คุณอชิรมา ชันชะริตร		ชื่อ :	คุณวุฒิเลิศ ทองดี	
วันที่ :	16/03/67		วันที่ :	16/03/67	
ข้อเสนอแนะ :			ข้อเสนอแนะ :		
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 15 มีนาคม 2567

เรียน : คุณจิรัญช์ สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240316.HSL.AKH.1

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/7)

[illegible]



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/7)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานลงเหล็กล่าง ชั้น 11



งานลงเหล็กล่างชั้น 11



งานลงเหล็กล่าง ชั้น 11



งานลงเหล็กล่างชั้น 11



งานก่ออิฐชั้นล่าง



งานก่ออิฐชั้นล่าง




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 16 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240318.HSL.AKH.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การรับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 4 แผ่น (หน้า 1/7)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 197 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ช่างเทคนิค			
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ชูรการ	1		
3. Safety	-	10. ช่างไม้	-		
4. สถาปนิก / วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน			
5. ผู้ควบคุมงาน	7	12. พนักงาน	84		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. แม่บ้าน	2		
7. ช่างเขียนแบบ	3	14. อื่นๆ	2		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			แนวทางการแก้ไข		
1. Tower Crane	2	4. Generator	-		
2. Backhoe	-	5. Mobile Crane	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Backhoe	-		
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด			ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		
ลายเซ็น :			ลายเซ็น :		
ชื่อ :	คุณอชิรมา ชันชะริตร		ชื่อ :	คุณวุฒิเลิศ ทองดี	
วันที่ :	18/03/67		วันที่ :	18/03/67	
ข้อเสนอแนะ :			ข้อเสนอแนะ :		
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 16 มีนาคม 2567

เรียน : คุณจิรัฏฐ์ สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240318.HSL.AKH.1

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/7)

[illegible]



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/7)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานลงสลิ้ง ชั้น 11



งานลงสลิ้งชั้น 11



งานลงสลิ้ง ชั้น 12



งานลงสลิ้งชั้น 12



งานก่ออิฐชั้นล่าง



งานก่ออิฐชั้นล่าง




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 17 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240318.HSL.AKH.2
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การรับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 4 แผ่น (หน้า 1/5)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 197 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ช่างเทคนิค			
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ชุรการ	1		
3. Safety	-	10. ช่างไม้	-		
4. สถาปนิก / วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน			
5. ผู้ควบคุมงาน	7	12. พนักงาน	84		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. แม่บ้าน	2		
7. ช่างเขียนแบบ	3	14. อื่นๆ	2		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			แนวทางการแก้ไข		
1. Tower Crane	2	4. Generator	-		
2. Backhoe	-	5. Mobile Crane	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Backhoe	-		
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด			ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		
ลายเซ็น :			ลายเซ็น :		
ชื่อ :	คุณอชิรมา ชันชะริตร		ชื่อ :	คุณวุฒิเลิศ ทองดี	
วันที่ :	18/03/67		วันที่ :	18/03/67	
ข้อเสนอแนะ :			ข้อเสนอแนะ :		
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 17 มีนาคม 2567

เรียน : คุณชิษฐ์ชัย สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240318.HSL.AKH.2

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/5)

[illegible]



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/5)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานลงสลิ้ง ชั้น 11



งานลงสลิ้งชั้น 11



งานลงสลิ้ง ชั้น 12



งานลงสลิ้งชั้น 12



งานก่ออิฐชั้นล่าง



งานก่ออิฐชั้นล่าง



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 18 มีนาคม 2567
 เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240319.HSL.NN.1
 อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
 การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
 เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
 (รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 12 แผ่น (หน้า 1/12)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 287 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1 8. ช่างสี 6	- ไม่มี			
2. วิศวกรโครงการ	1 9. ช่างการ 1				
3. Safety	2 10. ช่างไม้ 25				
4. สถาปนิก / วิศวกร	5 11. ช่างฉาบปูน 9				
5. ผู้ควบคุมงาน	5 12. ช่างงาน 88				
6. หัวหน้าคนงาน	5 13. ช่างบ้าน 2	แนวทางการแก้ไข			
7. ช่างเขียนแบบ	3 14. ช่างอื่น 17	- ไม่มี			
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Tower Crane	2 4. Generator -				
2. Backhoe	- 5. Mobile Crane -				
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	- 6. Backhoe -				
รายงานโดย :	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	ทบทวนโดย :	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		
ลายเซ็น :		ลายเซ็น :			
ชื่อ :	คุณนคร นามแดง	ชื่อ :	คุณวุฒิเลิศ ทองดี		
วันที่ :	19/03/67	วันที่ :	19/03/67		
ข้อเสนอแนะ :		ข้อเสนอแนะ :			
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____				เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC	



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/12)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานก่อผนังห้องน้ำ ชั้น 1



งานกำหนดตำแหน่งนั่งก่อ ชั้น 8



งานบันได FST-0 ชั้น 11



งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น 11



งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น 12




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 19 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240320.HSL.NN.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 12 แผ่น (หน้า 1/12)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 301 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1 8. ช่างสี 6	- ไม่มี			
2. วิศวกรโครงการ	1 9. ช่างการ 1				
3. Safety	2 10. ช่างไม้ 25				
4. สถาปนิก / วิศวกร	5 11. ช่างฉาบปูน 9				
5. ผู้ควบคุมงาน	5 12. ช่างปูน 88				
6. หัวหน้าคนงาน	5 13. ช่างปูน 2	แนวทางการแก้ไข			
7. ช่างเขียนแบบ	3 14. ช่างอื่น 17	- ไม่มี			
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Tower Crane	2 4. Generator -				
2. Backhoe	- 5. Mobile Crane -				
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	- 6. Backhoe -				
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด				
ลายเซ็น :	ลายเซ็น :				
ชื่อ : คุณนคร นามแดง	ชื่อ : คุณวุฒิเลิศ ทองดี				
วันที่ : 20/03/67	วันที่ : 20/03/67				
ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอแนะ				
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

เอกสารแนบรายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หั่วหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 19 มีนาคม 2567

เรียน : คุณชิรัสย์ สุการ

เลขที่ : DRP.2301.240320.HSL.NN.1

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/12)

ตึก A Zone B ชั้น 12	GL.9-15/B-D	75 คน	100%
ชั้น 15	GL.8-11/C-D	20 คน	100%
11	GL.8-11/C-D	คน	100%
ลานจอดรถ	ชั้น 2-4	6 คน	60%
	ชั้น 1	13 คน	20%



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/12)


รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานก่อผนังห้องน้ำ ชั้น 1



งานเหล็กริบบิ้นพื้น ชั้น 11

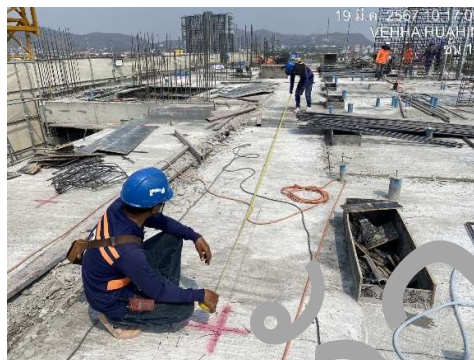


งานตรวจเส้นอ้างอิง ชั้น 11



งานเทคอนกรีตเสา ชั้น 11



งานเหล็กเสริมบันได FST-02 ชั้น 6

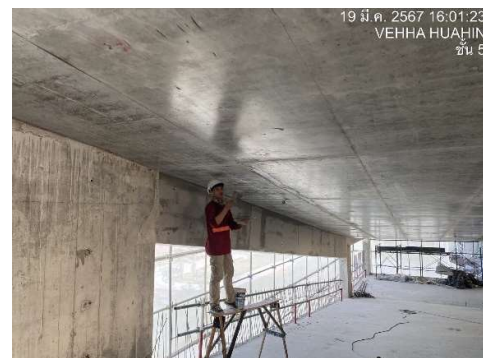

งานจัด แต่งผิวโครงสร้าง ชั้น 5




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 20 มีนาคม 2567
 เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240321.HSL.NN.1
 อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
 การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
 เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
 (รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 11 แผ่น (หน้า 1/11)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 289 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1 8. ช่างสี 6	- ไม่มี			
2. วิศวกรโครงการ	1 9. ช่างการ 1				
3. Safety	2 10. ช่างไม้ 25				
4. สถาปนิก / วิศวกร	5 11. ช่างฉาบปูน 9				
5. ผู้ควบคุมงาน	7 12. ช่างงาน 88				
6. หัวหน้าคนงาน	5 13. ช่างบ้าน 2	แนวทางการแก้ไข			
7. ช่างเขียนแบบ	3 14. ช่างอื่น 26	- ไม่มี			
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Tower Crane	2 4. Generator -				
2. Backhoe	- 5. Mobile Crane -				
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	- 6. Backhoe -				
รายงานโดย :	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	ทบทวนโดย :	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		
ลายเซ็น :		ลายเซ็น :			
ชื่อ :	คุณนคร นามแดง	ชื่อ :	คุณวุฒิเลิศ ทองดี		
วันที่ :	21/03/67	วันที่ :	21/03/67		
ข้อเสนอแนะ :		ข้อเสนอแนะ :			
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____				เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC	



เอกสารแนบรายงานการทำงานประจำวัน

วันที่ทำงาน : 20 มีนาคม 2567

เลขที่ : DRP.2301.240321.HSL.NN.1

(หน้า 2/11)

ตึก Zone B ชั้น 12	GL.9-13/B	70 คน	100%
รับพื้นที่ Zone A ชั้น 12	GL.1-8/B-D		100%
สถานจอดรถ	ชั้น 2-4	6 คน	60%
เตรียมงานฉาบผนัง	ชั้น 1	13 คน	20%



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/11)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานก่อผนัง ชั้น 1



งานเหล็กบันได ST-02 ชั้น 6



งานฉาบผิวผนังโครงสร้าง คอนกรีต ชั้น 3



งานตรวจสอบเหล็กเสริมเสา ชั้น 11



งานตรวจสอบไม้แบบและค้ำเสา ชั้น 11



งานเทคอนกรีตเสา ชั้น 11



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 21 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240322.HSL.NN.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 11 แผ่น (หน้า 1/11)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 294 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1 8. ช่างสี 6	- ไม่มี			
2. วิศวกรโครงการ	1 9. ช่างการ 1				
3. Safety	2 10. ช่างไม้ 25				
4. สถาปนิก / วิศวกร	5 11. ช่างฉาบปูน 9				
5. ผู้ควบคุมงาน	7 12. ช่างงาน 88				
6. หัวหน้าคนงาน	5 13. ช่างบ้าน 2	แนวทางการแก้ไข			
7. ช่างเขียนแบบ	3 14. ช่างอื่น 26	- ไม่มี			
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Tower Crane	2 4. Generator -				
2. Backhoe	- 5. Mobile Crane -				
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	- 6. Backhoe -				
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด				
ลายเซ็น :	ลายเซ็น :				
ชื่อ : คุณนคร นามแดง	ชื่อ : คุณวุฒิเลิศ ทองดี				
วันที่ : 22/03/67	วันที่ : 22/03/67				
ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอแนะ				
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/11)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานก่อผนัง ชั้น 1



งานเทคอนกรีต ST-02 ชั้น 6



งานฉาบผิวผนังโครงสร้าง คอนกรีต ชั้น 3



งานตรวจสอบเหล็กเสริมผนังกันตก ลานจอดรถ ชั้น 2



งานตรวจตำแหน่งผนังก่ออิฐ ชั้น 8



งานรื้อไม้แบบเสา ชั้น 11




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 22 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240323.HSL.NN.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 13 แผ่น (หน้า 1/13)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 306 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1 8. ช่างสี 6	- ไม่มี			
2. วิศวกรโครงการ	1 9. ช่างการ 1				
3. Safety	2 10. ช่างไม้ 28				
4. สถาปนิก / วิศวกร	5 11. ช่างฉาบปูน 9				
5. ผู้ควบคุมงาน	7 12. ช่างงาน 8				
6. หัวหน้าคนงาน	5 13. ช่างบ้าน 2	แนวทางการแก้ไข			
7. ช่างเขียนแบบ	4 14. ช่างอื่น 24	- ไม่มี			
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Tower Crane	2 4. Generator -				
2. Backhoe	- 5. Mobile Crane -				
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	- 6. Backhoe -				
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด				
ลายเซ็น :	ลายเซ็น :				
ชื่อ : คุณนกร นามแดง	ชื่อ : คุณวุฒิเลิศ ทองดี				
วันที่ : 23/03/67	วันที่ : 23/03/67				
ข้อเสนอแนะ : _____	ข้อเสนอแนะ : _____				
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



เอกสารแนบรายงานการทำงานประจำวัน

วันที่ทำงาน : 22 มีนาคม 2567

เลขที่ : DRP.2301.240323.HSL.NN.1

(หน้า 2/13)

รับพน Zone B ชั้น 13	GL.8-15/B	75 คน	50%
-13	GL.10-11/C-D	6 คน	0%
ลานจอดรถ	ชั้น 2-4	6 คน	60%
เตรียมงานคาบผนัง	ชั้น 1	13 คน	80%
	ชั้น 5	5 คน	10%



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/13)


รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานก่อผนัง ชั้น 1




งานเหล็กเสริมและจัดวางงานจอตลอด ชั้น 2

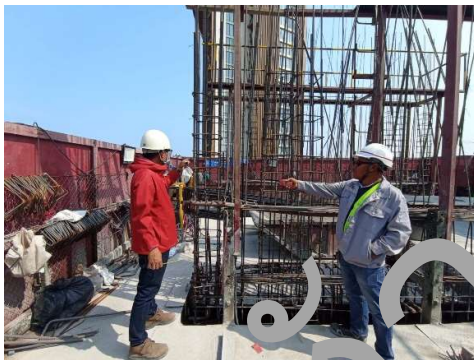

งานเหล็กเสริมผนังลิฟต์ ชั้น 14-15



งานตรวจสอบตำแหน่งผนังก่ออิฐ ชั้น 8

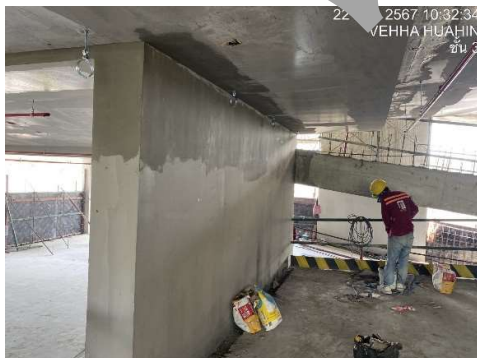

งานฉาบผิวบาง ลานจอตลอด ชั้น 3



งานไม้แบบและเหล็กเสริมพื้น ชั้น 12




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 23 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240325.HSL.NN.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 10 แผ่น (หน้า 1/10)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 307 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	- 8. ช่างสี 6	- ไม่มี			
2. วิศวกรโครงการ	1 9. ชูรการ 1				
3. Safety	2 10. ช่างไม้ 28				
4. สถาปนิก / วิศวกร	5 11. ช่างฉาบปูน 9				
5. ผู้ควบคุมงาน	7 12. ช่างปูน 8				
6. หัวหน้าคนงาน	- 13. ช่างปูน 2	แนวทางการแก้ไข			
7. ช่างเขียนแบบ	4 14. ช่างอื่น 24	- ไม่มี			
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Tower Crane	2 4. Generator -				
2. Backhoe	- 5. Mobile Crane -				
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	- 6. Backhoe -				
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด				
ลายเซ็น :	ลายเซ็น :				
ชื่อ : คุณนคร นามแดง	ชื่อ : คุณวุฒิเลิศ ทองดี				
วันที่ : 25/03/67	วันที่ : 25/03/67				
ข้อเสนอแนะ : _____	ข้อเสนอแนะ : _____				
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



เอกสารแนบรายงานการทำงานประจำวัน

วันที่ทำงาน : 23 มีนาคม 2567

เลขที่ : DRP.2301.240325.HSL.NN.1

(หน้า 2/10)

พื้นที่	ระดับชั้น	จำนวนคน	ร้อยละ
พื้นที่ Zone B	ชั้น 13	GL.8-15/B	50%
พื้นที่ Zone C	ชั้น 13	GL.10-11/C-D	6 คน
พื้นที่ Zone D	ชั้น 15-16	GL.8-11/C-D	1 คน
พื้นที่ Zone E	ชั้น 2-4	6 คน	60%
พื้นที่ Zone F	ชั้น 1	13 คน	80%



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง


โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/10)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานก่อผนัง ชั้น 1

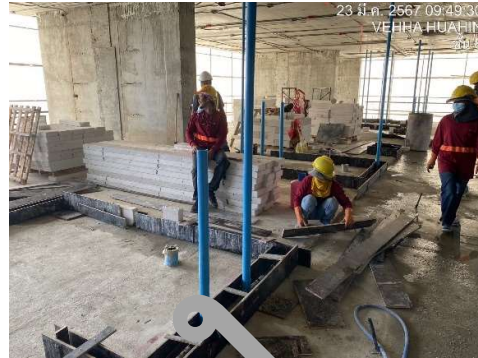

งานก่อผนัง ชั้น 8



งานฉาบผนัง ชั้น 8



งานเทคอนกรีต Slip Form ชั้น 15-16



งานติดตั้งสลิงและเหล็กเสริมพื้น Zone A ชั้น 12



งานไม้แบบและเหล็กเสริมพื้น Zone B ชั้น 13




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 24 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240325.HSL.NN.2
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 10 แผ่น (หน้า 1/10)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 293 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	- 8. ช่างสี	- ไม่มี			
2. วิศวกรโครงการ	1 9. ชูรการ		1		
3. Safety	2 10. ช่างไม้		22		
4. สถาปนิก / วิศวกร	2 11. ช่างฉาบปูน		9		
5. ผู้ควบคุมงาน	7 12. ช่างปูน		88		
6. หัวหน้าคนงาน	5 13. ช่างปูน		2		
7. ช่างเขียนแบบ	2 14. ช่างอื่น		20		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			แนวทางการแก้ไข		
1. Tower Crane	2 4. Generator		-		
2. Backhoe	- 5. Mobile Crane		-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	- 6. Backhoe		-		
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด				
ลายเซ็น :	ลายเซ็น :				
ชื่อ : คุณนคร นามแดง	ชื่อ : คุณวุฒิเลิศ ทองดี				
วันที่ : 25/03/67	วันที่ : 25/03/67				
ข้อเสนอแนะ : _____	ข้อเสนอแนะ : _____				
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

เอกสารแนบรายงานการทำงานประจำวัน

วันที่ทำงาน : 24 มีนาคม 2567

เลขที่ : DRP.2301.240325.HSL.NN.2

(หน้า 2/10)

B ชั้น 12	GL.2-15/B		100%
-13	GL.10-11/C-D	6 คน	20%
ลานจอดรถ	ชั้น 2-4	6 คน	30%
ตึกรมงานคาบผนัง	ชั้น 1	13 คน	40%
	ชั้น 5	5 คน	5%



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/10)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานก่อผนัง ชั้น 1



งานวาง 1-8




งานบันได FST-01 ชั้น 12-13



งานไม้แบบพื้นชั้น ชั้น 12



งานไม้แบบและเหล็กเสริมพื้น Zone B ชั้น 13

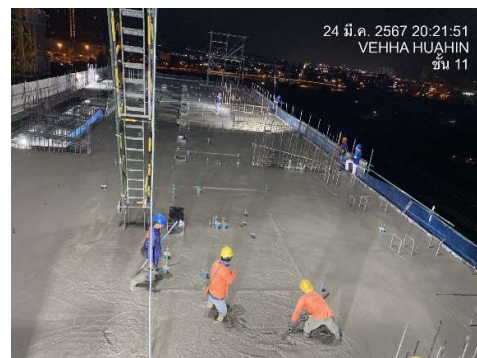

งานเทคอนกรีตพื้น Zone A ชั้น 12




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 25 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240326.HSL.AKH.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การรับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 4 แผ่น (หน้า 1/7)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 193 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ช่างเทคนิค			
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ชุรการ	1		
3. Safety	-	10. ช่างไม้	-		
4. สถาปนิก / วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน			
5. ผู้ควบคุมงาน	7	12. พนักงาน	80		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. แม่บ้าน	2		
7. ช่างเขียนแบบ	3	14. อื่นๆ	2		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			แนวทางการแก้ไข		
1. Tower Crane	2	4. Generator	-		
2. Backhoe	-	5. Mobile Crane	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Backhoe	-		
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด			ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		
ลายเซ็น :			ลายเซ็น :		
ชื่อ :	คุณอชิรมา ชันชะริตร		ชื่อ :	คุณวุฒิเลิศ ทองดี	
วันที่ :	26/03/67		วันที่ :	26/03/67	
ข้อเสนอแนะ :			ข้อเสนอแนะ :		
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 25 มีนาคม 2567

เรียน : คุณชิษฐ์ชัย สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240326.HSL.AKH.1

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/7)

[illegible]



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/7)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานลงสลิ้ง ชั้น 13



งานลงสลิ้งชั้น 13



งานตรวจเหล็กเสา ชั้น 11



งานเทเสาคอนกรีตชั้น 12



งานก่ออิฐชั้น 8



งานก่ออิฐชั้น 8




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 26 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240327.HSL.AKH.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การรับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 4 แผ่น (หน้า 1/7)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 193 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ช่างเทคนิค			
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ชุรการ	1		
3. Safety	-	10. ช่างไม้	-		
4. สถาปนิก / วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน			
5. ผู้ควบคุมงาน	7	12. พนักงาน	80		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. แม่บ้าน	2		
7. ช่างเขียนแบบ	3	14. อื่นๆ	2		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			แนวทางการแก้ไข		
1. Tower Crane	2	4. Generator	-		
2. Backhoe	-	5. Mobile Crane	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Backhoe	-		
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด			ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		
ลายเซ็น :			ลายเซ็น :		
ชื่อ :	คุณอชิรมา ชันชะริตร		ชื่อ :	คุณวุฒิเลิศ ทองดี	
วันที่ :	27/03/67		วันที่ :	27/03/67	
ข้อเสนอแนะ :			ข้อเสนอแนะ :		
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 26 มีนาคม 2567

เรียน : คุณชิษฐ์ชัย สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240327.HSL.AKH.1

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/7)

[illegible]



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/7)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานตรวจพื้น post ชั้น 13



งานตรวจพื้น post ชั้น 13



งานเทพื้น post ชั้น 13



งานเทพื้น post ชั้น 13



งานตรวจตั้งเสาชั้น 12



งานก่ออิฐชั้น 8




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 27 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240328.HSL.AKH.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การรับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 4 แผ่น (หน้า 1/7)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม=212 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ช่างเทคนิค			
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ชุรการ	1		
3. Safety	2	10. ช่างไม้	30		
4. สถาปนิก / วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน	20		
5. ผู้ควบคุมงาน	7	12. พนักงาน	104		
6. หัวหน้าคนงาน	5	13. แม่บ้าน	2		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	4	14. กรรมาธิการ	22		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Tower Crane	2	4. Generator	-		
2. Backhoe	-	5. Mobile Crane	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Backhoe	-		
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด			
ลายเซ็น :		ลายเซ็น :			
ชื่อ : คุณอชิรมา ชันชะริตร		ชื่อ : คุณวุฒิเลิศ ทองดี			
วันที่ : 28/03/67		วันที่ : 28/03/67			
ข้อเสนอแนะ		ข้อเสนอแนะ			
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 27 มีนาคม 2567

เรียน : คุณจิรัฏฐ์ สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240328.HSL.AKH.1

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/7)

[illegible]



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/7)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานตรวจเหล็กเสาคอนกรีตเสาคอนกรีต



งานเทคอนกรีตเสาคอนกรีต



งานเทพื้นสลิฟฟอร์ม



งานเทพื้นสลิฟฟอร์ม



งานก่ออิฐชั้น



งานก่ออิฐชั้น




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 28 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240329.HSL.AKH.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การรับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 4 แผ่น (หน้า 1/7)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม=212 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ช่างเทคนิค			
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ชูรการ	1		
3. Safety	2	10. ช่างไม้	30		
4. สถาปนิก / วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน	20		
5. ผู้ควบคุมงาน	7	12. พนักงาน	104		
6. หัวหน้าคนงาน	5	13. แม่บ้าน	2		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	4	14. กรรมาธิการ	22		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Tower Crane	2	4. Generator	-		
2. Backhoe	-	5. Mobile Crane	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Backhoe	-		
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด			
ลายเซ็น :		ลายเซ็น :			
ชื่อ : คุณอชิรมา ชันชะริตร		ชื่อ : คุณวุฒิเลิศ ทองดี			
วันที่ : 29/03/67		วันที่ : 29/03/67			
ข้อเสนอแนะ		ข้อเสนอแนะ			
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 28 มีนาคม 2567

เรียน : คุณจิรัฏฐ์ สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240329.HSL.AKH.1

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/7)

[illegible]



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/7)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานลงเหล็กพื้นชั้น 13



งานลงเหล็กพื้นชั้น 13



งานเทพื้นชั้น 2



งานเทคานรับผนังชั้น 3



งานตรวจไลน์ก่อนเทคิบและก่ออิฐชั้น 2-3



งานตรวจไลน์ก่อนเทคิบและก่ออิฐชั้น 2-3




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 29 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240330.HSL.AKH.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การรับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 4 แผ่น (หน้า 1/7)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 212 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ช่างเทคนิค			
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ชูรการ	1		
3. Safety	2	10. ช่างไม้	30		
4. สถาปนิก / วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน	20		
5. ผู้ควบคุมงาน	7	12. คนงาน	104		
6. หัวหน้าคนงาน	5	13. แม่บ้าน	2		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	4	14. กรรมาธิการ	22		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Tower Crane	2	4. Generator	-		
2. Backhoe	-	5. Mobile Crane	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Backhoe	-		
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด			
ลายเซ็น :		ลายเซ็น :			
ชื่อ : คุณอชิรมา ชันชะริตร		ชื่อ : คุณวุฒิเลิศ ทองดี			
วันที่ : 30/03/67		วันที่ : 30/03/67			
ข้อเสนอแนะ		ข้อเสนอแนะ			
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

ถึง : บริษัท หั่วหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด
เรียน : คุณจิรวัสส์ ธรรมการ

วันที่ทำงาน : 29 มีนาคม 2567

เลขที่ : DRP.2301.240330.HSL.AKH.1

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/7)

[illegible]



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/7)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานลงเหล็กพื้นชั้น 13



งานลงเหล็กพื้นชั้น 13



งานบันไดชั้น 13-14



งานลงเหล็กพื้นชั้น 13



งานตรวจก่ออิฐชั้น 8



งานตรวจก่ออิฐชั้น 8




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 29 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240331.HSL.AKH.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การรับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 4 แผ่น (หน้า 1/7)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 212 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ช่างเทคนิค			
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ชุรการ	1		
3. Safety	2	10. ช่างไม้	30		
4. สถาปนิก / วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน	20		
5. ผู้ควบคุมงาน	7	12. คนงาน	104		
6. หัวหน้าคนงาน	5	13. แม่บ้าน	2		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	4	14. กรรมาธิการ	22		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Tower Crane	2	4. Generator	-		
2. Backhoe	-	5. Mobile Crane	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Backhoe	-		
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด			
ลายเซ็น :		ลายเซ็น :			
ชื่อ : คุณอชิรมา ชันชะริตร		ชื่อ : คุณวุฒิเลิศ ทองดี			
วันที่ : 31/03/67		วันที่ : 31/03/67			
ข้อเสนอแนะ		ข้อเสนอแนะ			
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

ถึง : บริษัท หั่วหิ้น สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 29 มีนาคม 2567

เรียน : คุณชิษฐ์ชัย สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240331.HSL.AKH.1

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/7)

[illegible]



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/7)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานลงเหล็กพื้นชั้น 13



งานลงเหล็กพื้นชั้น 13



งานบันไดชั้น 13-14



งานลงเหล็กพื้นชั้น 13



งานตรวจก่ออิฐชั้น 8



งานตรวจก่ออิฐชั้น 8




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 31 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240401.HSL.AKH.2
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การรับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 8.30 น. เวลาเลิกงาน : 17.30 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 4 แผ่น (หน้า 1/5)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 212 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ช่างเทคนิค			
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ชูรการ	1		
3. Safety	2	10. ช่างไม้	30		
4. สถาปนิก / วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน	20		
5. ผู้ควบคุมงาน	7	12. ช่างงาน	104		
6. หัวหน้าคนงาน	5	13. แม่บ้าน	2		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	4	14. กรรมาธิการ	22		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Tower Crane	2	4. Generator	-		
2. Backhoe	-	5. Mobile Crane	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Backhoe	-		
รายงานโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด			ทบทวนโดย : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		
ลายเซ็น :			ลายเซ็น :		
ชื่อ :	คุณอชิรมา ชันชะริตร		ชื่อ :	คุณวุฒิเลิศ ทองดี	
วันที่ :	01/04/67		วันที่ :	01/04/67	
ข้อเสนอแนะ :			ข้อเสนอแนะ :		
สำเนา : ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____			เขียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC		



โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 31 มีนาคม 2567

เรียน : คุณจิรัฏฐ์ สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240401.HSL.AKH.1

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/5)

[illegible]



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง


โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/5)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานผูกเหล็กเสาชั้น 13

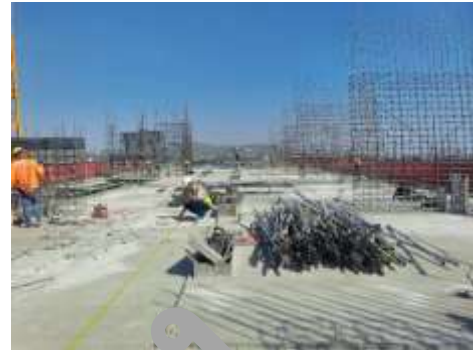

งานผูกเหล็กเสาชั้น 13



งานเทเสาคอนกรีตชั้น 1



งานเทเสาคอนกรีตชั้น 13



งานตรวจสอบไลน์พื้นชั้น 13



งานตรวจก่ออิฐชั้น 8





ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 1 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240302.HSL.SCHU.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 6 แผ่น (หน้า 1 / 10)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 41 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	2	8. ชูการ	ไม่มี		
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า			
3. Safety	1	10. ช่างประปา			
4. สถาปนิก / วิศวกร	7	11. ช่างฉาบผนัง			
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างฉาบ	แนวทางการแก้ไข		
6. หัวหน้าคนงาน	1	13. ช่างโครงสร้าง			
7. ช่างเขียนแบบ	3	14. อื่นๆ	ไม่มี		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Mobile Crane		4. Vibro hammer			
2. Silent Piler		5. Excavator			
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ		6. Crawler crane			
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : 			ลายเซ็น : 		
ชื่อ : <u>ศุภกร ชูจันทร์ทอง</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>02/03/67</u>			วันที่ : <u>02/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานติดตั้งท่อ, BOX SLEEVE FOR 9th



ติดตั้งท่อระบายน้ำ (ชั้นที่ 2)



งานติดตั้งท่อ RL, ลานจอดรถ (ชั้นที่ 3)



มาตรฐานตำแหน่ง Pipe Sleeve ห้องพัก (ชั้นที่ 9)




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท ห้วยหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 2 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240304.HSL.SCHU.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 6 แผ่น (หน้า 1 / 10)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 44 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	2	8. ชูการ	5		ไม่มี
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า	5		
3. Safety	1	10. ช่างประปา			
4. สถาปนิก / วิศวกร	8	11. ช่างฉาบปูน	8		
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างเชื่อม			
6. หัวหน้าคนงาน	1	13. ช่างตีเหล็ก	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	3	14. อื่นๆ			ไม่มี
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Mobile Crane		4. Vibro hammer			
2. Silent Piler		5. Excavator			
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ		6. Crawler crane			
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : 			ลายเซ็น : 		
ชื่อ : <u>ศุภกร ชูจันทร์ทอง</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>04/03/67</u>			วันที่ : <u>04/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานติดตั้งท่อ, BOX SLEEVE FOR WALL FIXTURE
FOR 9th FLOOR (PART 2)



ติดตั้งท่อค้ำเพดานจุด (ชั้นที่ 2)



ติดตั้ง sleeve Pipe ห้องพัก (ชั้นที่ 1)





ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 3 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240304.HSL.SCHU.2
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 6 แผ่น (หน้า 1 / 10)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 44 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	2	8. ชูการ	5		ไม่มี
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า	5		
3. Safety	1	10. ช่างประปา			
4. สถาปนิก/วิศวกร	8	11. ช่างฉาบปูน	8		
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างเชื่อม			
6. หัวหน้าคนงาน	1	13. ช่างตีเหล็ก	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	3	14. อื่นๆ			ไม่มี
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Mobile Crane		4. Vibro hammer			
2. Silent Piler		5. Excavator			
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ		6. Crawler crane			
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : 			ลายเซ็น : 		
ชื่อ : <u>ศุภกร ชูจันทร์ทอง</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>04/03/67</u>			วันที่ : <u>04/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/10)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานติดตั้งท่อ, BOX SLEEVE FOR WALL FIXTURE
FOR 9th FLOOR (PART 2)



งานติดตั้งท่อ BOX ฝังท่อคอนกรีตในบันไดของงานแสงสว่างและ
FIRE ALARM (FST02), (ชั้น 5 ขึ้นชั้น 6)



ติดตั้ง sleeve Pipe ห้องพัก (ชั้นที่ 9)



ส่งตรวจงานติดตั้ง sleeve Pipe ห้องพัก (ชั้นที่ 9)



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท ห้วยหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 4 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชวิสรักษ์ สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240305.HSL.TKA.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 2 แผ่น (หน้า 1/3)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 44 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	2	8. ชูการ	2	-	
2. วิศวกรโครงการ	2	9. ช่างไฟฟ้า	5		
3. ผู้ช่วยโครงการ	1	10. ช่างประปา	1		
4. สถาปนิก/วิศวกร	8	11. ช่างฉาบปูน	9		
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างเชื่อม	-		
6. หัวหน้าคนงาน	1	13. ช่างตีเหล็ก	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ	-		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Mobile Crane	-	4. Vibro hammer	-		
2. Silent Piler	-	5. Excavator	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Crawler crane	-		
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโลเอ็นซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโลเอ็นซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : <u>[ลายเซ็น]</u>			ลายเซ็น : <u>พ.จิตร</u>		
ชื่อ : <u>ธีระพงษ์ แก้วนิมพลี</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>05/03/67</u>			วันที่ : <u>05/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

เอกสารแนบรายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หั่วหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 4 มีนาคม 2567

เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240305.HSL.TKA.1

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/3)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1.	ติดตั้งท่อดับเพลิง ถานจอด ชั้น 2	GL.1-5/A-D	9	80%	
2.	ส่งตรวจงานติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 9	GL.1-8A-/D	8	100%	
3	งานติดตั้งท่อ, BOX SLEEVE FOR FIRE ALARM SYSTEM FOR CORRIDOR 11th FLOOR PLAN	GL.8/B-C	5	10%	

(หน้า 3/3)



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

	
ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 2	ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 2
	
ส่งตรวจงานติดตั้ง SLEEVE PIPE ห้องพัก (ชั้นที่ 9)	ส่งตรวจงานติดตั้ง sleeve Pipe ห้องพัก (ชั้นที่ 9)
	
งานติดตั้งท่อ, BOX SLEEVE FOR FIRE ALARM SYSTEM FOR CORRIDOR 11TH FLOOR PLAN	



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 5 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240306.HSL.TKA.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 2 แผ่น (หน้า 1/3)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 51 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	3	8. ชูการ	2	-	
2. วิศวกรโครงการ	2	9. ช่างไฟฟ้า	5		
3. ผู้ช่วยโครงการ	1	10. ช่างประปา	1		
4. สถาปนิก/วิศวกร	8	11. ช่างฉาบปูน	1		
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างเชื่อม	-		
6. หัวหน้าคนงาน	1	13. ช่างตีเหล็ก	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ	-		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Mobile Crane	-	4. Vibro hammer	-		
2. Silent Piler	-	5. Excavator	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Crawler crane	-		
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโลเอ็นซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโลเอ็นซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : <u>[ลายเซ็น]</u>			ลายเซ็น : <u>[ลายเซ็น]</u>		
ชื่อ : <u>ธีระพงษ์ แก้วนิมพลี</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>06/03/67</u>			วันที่ : <u>06/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

เอกสารแนบรายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 5 มีนาคม 2567

เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240306.HSL.TKA.1

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2 / 3)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเทือนไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1.	ติดตั้งท่อดับเพลิง ถานจอด ชั้น 2	GL.1-5/A-D	7	90%	
2.	ส่งงาน ติดตั้ง Sleeve Pipe FP บันได ST.1 ชั้น 10	GL.1-8A-/D	1	100%	
3	งานติดตั้งท่อ, BOX SLEEVE FOR FIXTURE FOR 9 th FLOOR (PART 1)	GL.1-8/A-D	5	90%	
4	ติดตั้งท่อ Sleeve Pipe ห้องพักชั้น 10	GL.8-15/A-D		50%	
5	ติดตั้งท่อดับเพลิง ถานจอด ชั้น 1	GL.1-5/A-D		30%	
6	ส่งตรวจงานท่อ FD,RL,CW	GL.8-15/A-D	1	100%	
7	งานติดตั้งท่อ, BOX SLEEVE FOR FIRE ALARM SYSTEM FOR CORRIDOR 11th FLOOR PLAN	GL.8/B-C	3	100%	
8	งานติดตั้งท่อ, BOX ฝั่งพื้นคอนกรีตในบันไดของงาน ส่ง สว่าง และ FIRE ALARM (FST01), (ชั้น 10-11)	GL.10-11/C-D	2	100%	

(หน้า 3 / 3)

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

	
ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 2	ส่งตรวจงานติดตั้ง sleeve Pipe FP บันได ST.1 (ชั้นที่ 10)
	
ส่งตรวจงานติดตั้ง SLEEVE PIPE FD, R, CW (ชั้นที่ 9)	ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 1
	
ติดตั้ง SLEEVE PIPE ห้องพัก (ชั้นที่ 10)	งานติดตั้งท่อ, BOX SLEEVE FOR FIXTURE FOR 9TH FLOOR (PART 1)



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

	
งานติดตั้งท่อ, BOX SLEEVE FOR FIRE ALARM SYSTEM FOR CORRIDOR 11th FLOOR PLAN	งานติดตั้งท่อ, BOX ฝังพื้นคอนกรีตในบันไดของงานแสงสว่าง และ FIRE ALARM (FST01), (ชั้น 9 ขึ้นชั้น 10)



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน


ถึง : บริษัท ห้วยหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 6 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชวิสรักษ์ สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240307.HSL.TKA.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 2 แผ่น (หน้า 1/3)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 52 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	3	8. ชูการ	2	-	
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า	5		
3. ผู้ช่วยโครงการ	1	10. ช่างประปา	1		
4. สถาปนิก/วิศวกร	8	11. ช่างฉาบปูน	1		
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างเชื่อม	-		
6. หัวหน้าคนงาน	1	13. ช่างตีเหล็ก	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ	-		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Mobile Crane	-	4. Vibro hammer	-		
2. Silent Piler	-	5. Excavator	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Crawler crane	-		
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโบลเอ็นซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโบลเอ็นซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : <u>[ลายเซ็น]</u>			ลายเซ็น : <u>[ลายเซ็น]</u>		
ชื่อ : <u>ธีระพงษ์ แก้วนิมพลี</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>07/03/67</u>			วันที่ : <u>07/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

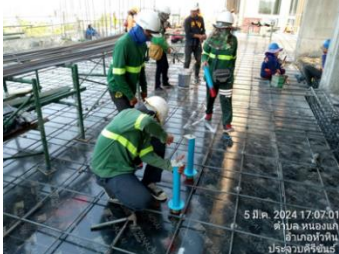	
ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 1	ติดตั้ง sleeve Pipe ห้องพัก(ชั้นที่ 10)
	
ประกอบ ท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 3	เชื่อมท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 2
	
ส่งตรวจงานติดตั้ง SLEEVE PIPE ห้องพัก (ชั้นที่ 10)	ส่งตรวจงานติดตั้ง SLEEVE PIPE ห้องพัก (ชั้นที่ 10)



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

	
งานติดตั้งท่อ, BOX SLEEVE FOR FIXTURE FOR 9th FLOOR (PART 1)	งานติดตั้งสายทองแดง LIGHTNING PROTECTION FOR 10th FLOOR (PART 2)



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท ห้วยหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 7 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240308.HSL.TKA.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 2 แผ่น (หน้า 1/3)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 50 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	3	8. ชูการ	2	-	
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า	5		
3. ผู้ช่วยโครงการ	1	10. ช่างประปา	1		
4. สถาปนิก/วิศวกร	8	11. ช่างฉาบผนัง	1		
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างฉาบ	-		
6. หัวหน้าคนงาน	1	13. ช่างตีเหล็ก	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ	-		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Mobile Crane	-	4. Vibro hammer	-		
2. Silent Piler	-	5. Excavator	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Crawler crane	-		
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโลเอ็นซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโลเอ็นซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : _____			ลายเซ็น : <u>พ.จิณ</u>		
ชื่อ : <u>ธีระพงษ์ แก้วนิมพลี</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>08/03/67</u>			วันที่ : <u>08/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC	



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

	
ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 1	ติดตั้ง sleeve Pipe ห้องพัก(ชั้นที่ 10)
	
เตรียมงาน SLEEVE PIPE ห้องพัก ชั้น 10	ติดตั้งท่อ RL ลานจอดชั้น 4
	
ส่งตรวจงานติดตั้ง SLEEVE PIPE บันได ST.2 (ชั้นที่ 6)	ส่งตรวจงานติดตั้ง SLEEVE PIPE บันได ST.2 (ชั้นที่ 6)



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

	
งานติดตั้งท่อ, BOX SLEEVE FOR FIXTURE FOR 10th FLOOR (PART 2)	งานติดตั้งท่อ, BOX ฝังพื้นคอนกรีตชั้น 6 ของงาน POWER AND COMMUNICATION SYSTEM FOR 5th FLOOR PLAN (PART



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 8 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240309.HSL.TKA.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 2 แผ่น (หน้า 1/3)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 41 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	-	8. ชูการ	1	-	
2. วิศวกรโครงการ	2	9. ช่างไฟฟ้า	5		
3. ผู้ช่วยโครงการ	1	10. ช่างประปา	1		
4. สถาปนิก/วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน	1		
5. ผู้ควบคุมงาน	2	12. ช่างเชื่อม	-		
6. หัวหน้าคนงาน	1	13. ช่างตีเหล็ก	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ	-		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Mobile Crane	-	4. Vibro hammer	-		
2. Silent Piler	-	5. Excavator	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Crawler crane	-		
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโลเอ็นซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโลเอ็นซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : <u>[ลายเซ็น]</u>			ลายเซ็น : <u>[ลายเซ็น]</u>		
ชื่อ : <u>ธีระพงษ์ แก้วนิมพลี</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>09/03/67</u>			วันที่ : <u>09/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

	
งานติดตั้งท่อ, BOX SLEEVE FOR FIXTURE FOR 10th FLOOR (PART 2)	งานติดตั้งท่อ, BOX ฝังพื้นคอนกรีตชั้น 6
	
เตรียมงาน SLEEVE PIPE ห้องพักรับ ชั้น 10	ติดตั้งท่อ RL ลานจอดรถชั้น 4
	
ส่งตรวจงานติดตั้ง SLEEVE PIPE บันได ST.2 (ชั้นที่ 6)	ส่งตรวจงานติดตั้ง SLEEVE PIPE บันได ST.2 (ชั้นที่ 6)



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

	
ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 1	ติดตั้ง sleeve Pipe ห้องพัก(ชั้นที่ 10)



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 9 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชวิสรักษ์ สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240311.HSL.TKA.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 2 แผ่น (หน้า 1/3)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 36 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	2	8. ชูการ	1		
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า	5		
3. ผู้ช่วยโครงการ	-	10. ช่างประปา	1		
4. สถาปนิก/วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน	5		
5. ผู้ควบคุมงาน	2	12. ช่างเชื่อม	-		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. ช่างตีเหล็ก	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ	-		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Mobile Crane	-	4. Vibro hammer	-		
2. Silent Piler	-	5. Excavator	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Crawler crane	-		
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโลเอ็นซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโลเอ็นซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : _____			ลายเซ็น : <u>พ.จิณ</u>		
ชื่อ : <u>ธีระพงษ์ แก้วนิมพลี</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>11/03/67</u>			วันที่ : <u>11/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

เอกสารแนบรายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท ห้วยหิน สาขา ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 9 มีนาคม 2567

เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240311.HSL.TKA.1

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/3)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายออกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1.	ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 1	GL.1-5/A-D	2	70%	
2.	ประกอบท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 3	GL.1-5/A-D	1	100%	
3	ติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 10	GL.1-8/A-D	10	60%	
4	ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 3	GL.1-5/A-D	2	20%	
5	งานติดตั้งสายทองแดง LIGHTNING PROTECTION SYSTEM FOR 10th FLOOR (PART 1)	GL.1-9/A-D	5	50%	

(หน้า 3/3)

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

	
ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 1	ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 1
	
ประกอบท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 1	ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 3
	
ติดตั้ง SLEEVE PIPE ห้องพัก ชั้น 10	งานติดตั้งสายทองแดง LIGHTNING PROTECTION SYSTEM FOR 10TH FLOOR (PART 1)



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 10 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240311.HSL.TKA.2
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 2 แผ่น (หน้า 1/3)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 24 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ชูการ	1	-	
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ช่างไฟฟ้า	5		
3. ผู้ช่วยโครงการ	-	10. ช่างประปา	-		
4. สถาปนิก/วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน	-		
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างเชื่อม	-		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. ช่างตีเหล็ก	-		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ	-		-
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Mobile Crane	-	4. Vibro hammer	-		
2. Silent Piler	-	5. Excavator	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Crawler crane	-		
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโบลเอ็นซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโบลเอ็นซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : _____			ลายเซ็น : <u>พ.จิตร</u>		
ชื่อ : <u>ธีระพงษ์ แก้วนิมพลี</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>11/03/67</u>			วันที่ : <u>11/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC	



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

เอกสารแนบรายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 10 มีนาคม 2567

เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240311.HSL.TKA.2

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/3)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1.	ติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 10	GL.1-8/A-D	4	90%	
2.	งานติดตั้งสายทองแดง LIGHTNING PROTECTIONSYSTEM FOR 10th FLOOR (PART 1)	GL.1-9/A-D	5	100%	
3	ส่งตรวจงาน ติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 10	GL.1-8/A-D	4	80%	
4	งานติดตั้ง BLOCK OUT ฟังก์ชั่นคอนกรีต SLEEVE FORFIXTURE FOR 10th FLOOR (PART 1)	GL.1-3/A-D	4	100%	

(หน้า 3/3)



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

	
ติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 10	ติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 10
	
ส่งงาน ติดตั้ง SLEEVE PIPE ห้องพัก ชั้น 10	ส่งงาน ติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 10
	
งานติดตั้งสายทองแดง LIGHTNING PROTECTION SYSTEM FOR 10TH FLOOR (PART 1)	งานติดตั้ง BLOCK OUT ฟังพื้นคอนกรีต SLEEVE FOR FIXTURE FOR 10TH FLOOR (PART 1)





ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 11 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240312.HSL.SCHU.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 6 แผ่น (หน้า 1 / 10)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 53 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	3	8. ชูการ	5		ไม่มี
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า	5		
3. Safety		10. ช่างประปา	1		
4. สถาปนิก / วิศวกร	8	11. ช่างฉาบปูน	5		
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างเชื่อม			
6. หัวหน้าคนงาน		13. ช่างตีเหล็ก	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ			
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			ไม่มี		
1. Mobile Crane		4. Vibro hammer			
2. Silent Piler		5. Excavator			
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ		6. Crawler crane			
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : 			ลายเซ็น : 		
ชื่อ : <u>ศุภกร ชูจันทร์ทอง</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>12/03/67</u>			วันที่ : <u>12/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน




ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 1



ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 3



ติดตั้ง sleeve Pipe ห้องพัก (ชั้น 10)

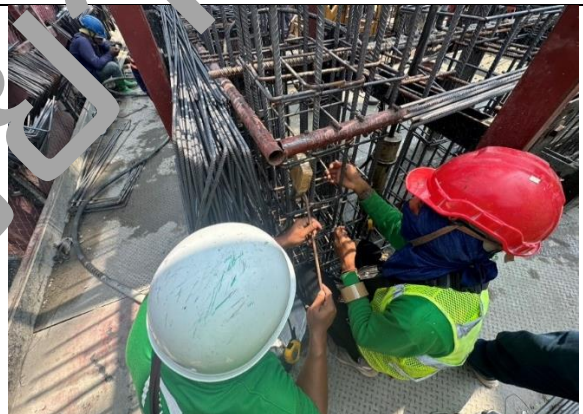

งานติดตั้งท่อ, BOX SLEEVE FOR FIRE ALARM SYSTEM FOR
CORRIDOR 12th FLOOR PLAN



งานติดตั้งท่อ, BOX ผังพื้นที่คอนกรีตในบันไดของงานแสงสว่าง
และ FIRE ALARM (FST01), (ชั้น 10 ขึ้นชั้น 11)





ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 12 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240313.HSL.SCHU.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 6 แผ่น (หน้า 1 / 10)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 53 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	3	8. ชูการ	5		ไม่มี
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า	5		
3. Safety		10. ช่างประปา	1		
4. สถาปนิก / วิศวกร	8	11. ช่างฉาบผนัง	5		
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างฉาบ			
6. หัวหน้าคนงาน		13. ช่างโครงสร้าง	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ			
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			ไม่มี		
1. Mobile Crane		4. Vibro hammer			
2. Silent Piler		5. Excavator			
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ		6. Crawler crane			
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : 			ลายเซ็น : 		
ชื่อ : <u>ศุภกร ชูจันทร์ทอง</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>13/03/67</u>			วันที่ : <u>13/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เขียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	


รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 1



ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 3

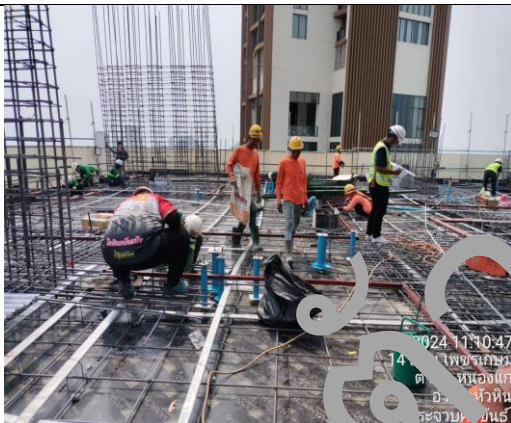


ติดตั้ง sleeve Pipe ห้องพัก (ชั้น 1)



งานติดตั้งท่อ, BOX SLEEVE FOR FIRE ALARM SYSTEM FOR CORRIDOR 12th FLOOR PLAN



ทำงานติดตั้ง Sleeve Pipe FD,RL,CW ชั้น 10

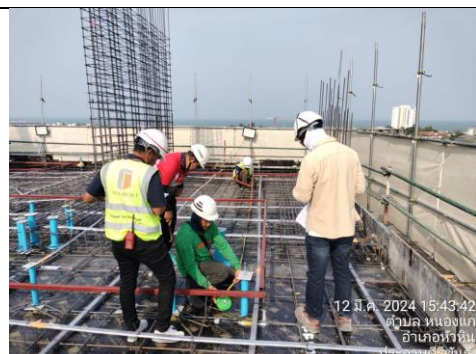

ทำงานติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 11

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานติดตั้งท่อ, BOX SLEEVE FOR FIXTURE FOR 10th
FLOOR (PART 1)



งานติดตั้ง BLOCK OUT ฝังพื้นคอนกรีต SLEEVE FOR FIXTURE
FOR 11th FLOOR (PART 2)




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 13 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240314.HSL.SCHU.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 6 แผ่น (หน้า 1 / 10)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 47 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	2	8. ชูการ	5		ไม่มี
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า	5		
3. Safety		10. ช่างประปา	2		
4. สถาปนิก / วิศวกร	7	11. ช่างฉาบผนัง	1		
5. ผู้ควบคุมงาน	2	12. ช่างฉาบ			
6. หัวหน้าคนงาน		13. ช่างโครงสร้าง	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ			
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			ไม่มี		
1. Mobile Crane		4. Vibro hammer			
2. Silent Piler		5. Excavator			
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ		6. Crawler crane			
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : 			ลายเซ็น : 		
ชื่อ : <u>ศุภกร ชูจันทร์ทอง</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>14/03/67</u>			วันที่ : <u>14/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 1



ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 3



เตรียมงานติดตั้ง sleeve Pipe ห้องที่ 11)



หาไลน์ติดตั้ง ซัพพอร์ท ท่อ SPk ชั้น 4



ต่อท่อห้องน้ำชั้น 1



งานติดตั้งท่อเหินฝ้า ห้อง Kid Club ชั้น 1



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 4/10)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานติดตั้งท่อเหื้อฟ้า ห้อง Kid Club ชั้น 1

ตัวอย่าง



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 14 มีนาคม 2567
 เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240315.HSL.SCHU.1
 อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
 การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
 เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
 (รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 6 แผ่น (หน้า 1 / 10)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 47 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	3	8. ชูการ	5		ไม่มี
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า	8		
3. Safety		10. ช่างประปา			
4. สถาปนิก / วิศวกร	8	11. ช่างฉาบปูน	8		
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างเชื่อม			
6. หัวหน้าคนงาน	1	13. ช่างตีเหล็ก	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ			ไม่มี
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Mobile Crane		4. Vibro hammer			
2. Silent Piler		5. Excavator			
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ		6. Crawler crane			
รายงานโดย :	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	ทบทวนโดย :	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		
ลายเซ็น :		ลายเซ็น :			
ชื่อ :	ศุภกร ชูจันทร์ทอง	ชื่อ :	วุฒิเลิศ ทองดี		
วันที่ :	15/03/67	วันที่ :	15/03/67		
ข้อเสนอแนะ :		ข้อเสนอแนะ :			
สำเนา : ☒ HSL ☐ ☐ ☐			เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ		

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



เจาะซีพอสท่อ S,W,KW,RL,ชั้น B1




ติดตั้งท่อร้อยเคเบิล ลานจอดรถ ชั้น 3




เตรียมงานติดตั้ง sleeve Pipe ห้องพัก (ชั้นที่ 11)



หาไลน์ ติดตั้ง ซีพอส ท่อ SPk ชั้น 4

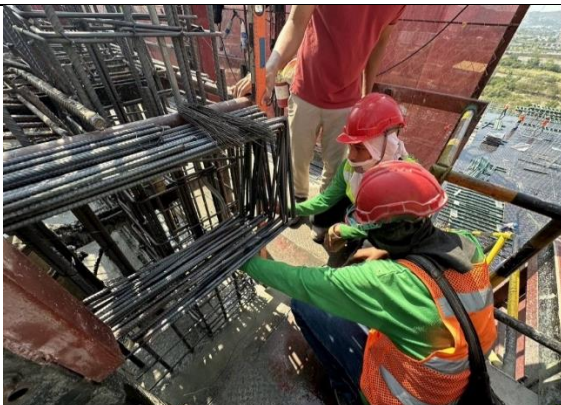

งานติดตั้งท่อ, BOX SLIPFORM ชั้น 13-14

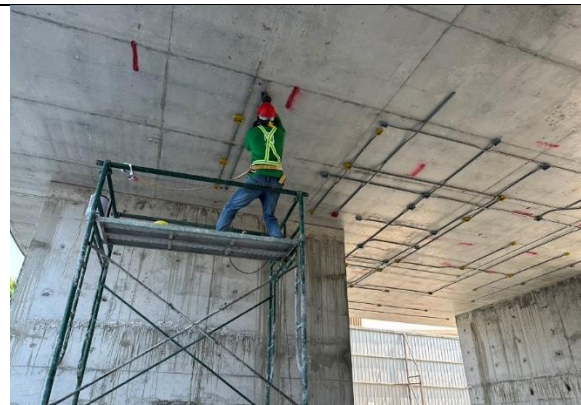

งานติดตั้งท่อไฟฟ้าเหนือฝ้า ห้อง Kid Club ชั้น 1





ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 15 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240316.HSL.SCHU.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 6 แผ่น (หน้า 1 / 10)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 48 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	3	8. ชูการ	5		ไม่มี
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า	10		
3. Safety		10. ช่างประปา			
4. สถาปนิก / วิศวกร	7	11. ช่างฉาบผนัง	8		
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างฉาบ			แนวทางการแก้ไข
6. หัวหน้าคนงาน	1	13. ช่างโครงสร้าง	1		
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ			
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			ไม่มี		
1. Mobile Crane		4. Vibro hammer			
2. Silent Piler		5. Excavator			
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ		6. Crawler crane			
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : 			ลายเซ็น : 		
ชื่อ : <u>ศุภกร ชูจันทร์ทอง</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>16/03/67</u>			วันที่ : <u>16/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



เจาะช่องพอสท่อ S,W,KW,RL,ชั้น B1



ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 3



งานติดตั้ง sleeve Pipe ห้องพัก (ชั้น 11)



ติดตั้งท่อ SPk ชั้น 4



งานติดตั้ง BLOCK OUT ฝังพื้นคอนกรีต SLEEVE FOR
FIXTURE 11th FLOOR (PART 1)





ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท ห้วยหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 16 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240318.HSL.SCHU.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 6 แผ่น (หน้า 1 / 10)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 52 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	3	8. ชูการ	5		ไม่มี
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า	10		
3. Safety		10. ช่างประปา	1		
4. สถาปนิก / วิศวกร	7	11. ช่างฉาบผนัง	1		
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างฉาบ			
6. หัวหน้าคนงาน		13. ช่างโครงสร้าง	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ			
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			ไม่มี		
1. Mobile Crane		4. Vibro hammer			
2. Silent Piler		5. Excavator			
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ		6. Crawler crane			
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : 			ลายเซ็น : 		
ชื่อ : <u>ศุภกร ชูจันทร์ทอง</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>18/03/67</u>			วันที่ : <u>18/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



ติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 12




ติดตั้งท่อดับเพลิง ถานจอด ชั้น 3



งานติดตั้ง sleeve Pipe ห้องพัก (ชั้น 11)



ประกอบท่อดับเพลิง ชั้น 4*

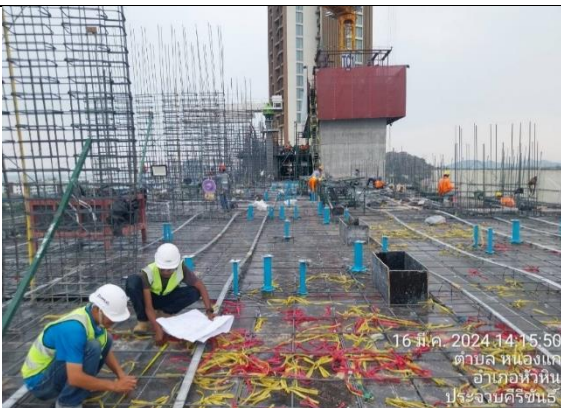

งานติดตั้ง BLOCK OUT ฝังพื้นคอนกรีต SLEEVE FOR
FIXTURE 11th FLOOR (PART 1)





ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 17 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240318.HSL.SCHU.2
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 6 แผ่น (หน้า 1 / 10)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ			
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”							
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 27 คน)			ปัญหาและอุปสรรค					
1. ผู้จัดการโครงการ	8. ชูการ	ไม่มี						
2. วิศวกรโครงการ	2							
3. Safety								
4. สถาปนิก / วิศวกร	2							
5. ผู้ควบคุมงาน	1							
6. หัวหน้าคนงาน		แนวทางการแก้ไข						
7. ช่างเขียนแบบ	1							
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			ไม่มี					
1. Mobile Crane								
2. Silent Piler								
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ								
4. Vibro hammer								
5. Excavator								
6. Crawler crane								
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>					
ลายเซ็น : 			ลายเซ็น : 					
ชื่อ : <u>ศุภกร ชูจันทร์ทอง</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>					
วันที่ : <u>18/03/67</u>			วันที่ : <u>18/03/67</u>					
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____					
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ				

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานติดตั้ง BLOCK OUT ฝังพื้นคอนกรีต SLEEVE FOR
FIXTURE 11th FLOOR (PART 1)



งานติดตั้ง BLOCK OUT ฝังพื้นคอนกรีต SLEEVE FOR
FIXTURE 12th FLOOR (PART 2)



งานติดตั้งท่อ, BOX ฝังพื้นคอนกรีต ฝังไฟ ของ ระบบแสง
สว่างและ FIRE ALARM (FST01), (ช่าง ชื่นชื่น 12)



ติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 11



ประกอบท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 4



ส่งงานติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 12

17/3/24 17:09 น.
ประจวบศิริพันธ์
VEHHA HUAHIN



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท ห้วยหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 18 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240319.HSL.TKA.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 2 แผ่น (หน้า 1/3)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 44 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	2	8. ชูการ	1		
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า	10		
3. ผู้ช่วยโครงการ	-	10. ช่างประปา			
4. สถาปนิก/วิศวกร	8	11. ช่างฉาบปูน	5		
5. ผู้ควบคุมงาน	1	12. ช่างเชื่อม	-		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. ช่างตีเหล็ก	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ	-		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Mobile Crane	-	4. Vibro hammer	-		
2. Silent Piler	-	5. Excavator	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Crawler crane	-		
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโบลเอ็นซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโบลเอ็นซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : <u>[ลายเซ็น]</u>			ลายเซ็น : <u>[ลายเซ็น]</u>		
ชื่อ : <u>ธีระพงษ์ แก้วนิมพลี</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>19/03/67</u>			วันที่ : <u>19/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

เอกสารแนบรายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หั่วหิน สภาข ลิฟวิ้ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 18 มีนาคม 2567

เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240319.HSL.TKA.1

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/3)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1.	เตรียม Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 12	GL.1-8/A-D	7	60%	
2.	ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 3	GL.1-5/A-D	3	100%	
3	ส่งงานติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 11	GL.1-8/A-D	4	100%	
4	ประกอบท่อดับเพลิง ชั้น 4	GL.1-8/A-D	2	70%	
5	งานติดตั้งท่อ, BOX ฟังเสา SLEEVE FOR FIXTURE 11th FLOOR (PART 1)	GL.1-9/A-D	5	25%	
6	งานติดตั้ง BLOCK OUT ฟังพื้นคอนกรีต SLEEVE FOR FIXTURE 11th FLOOR (PART 1)	GL.1-3/A-D	5	100%	

(หน้า 3/3)

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

	
เตรียมงานติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 12	ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอดรถ ชั้น 3
	
ส่งงานติดตั้ง SLEEVE PIPE ห้องพัก ชั้น 12	ประกอบท่อดับเพลิง ชั้น 4
	
งานติดตั้งท่อ, BOX ฝังเสา SLEEVE FOR FIXTURE 11TH FLOOR	งานติดตั้ง BLOCK OUT ฝังพื้นคอนกรีต SLEEVE FOR FIXTURE 11TH FLOOR (PART 1)



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท ห้วยหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 19 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชวิสรักษ์ สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240320.HSL.TKA.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 2 แผ่น (หน้า 1/3)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 44 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	2	8. ชูการ	2		
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า	10		
3. ผู้ช่วยโครงการ	-	10. ช่างประปา			
4. สถาปนิก/วิศวกร	8	11. ช่างฉาบปูน	1		
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างเชื่อม	-		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. ช่างตีเหล็ก	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ	-		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Mobile Crane	-	4. Vibro hammer	-		
2. Silent Piler	-	5. Excavator	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Crawler crane	-		
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโบลเอ็นซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโบลเอ็นซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : <u>[ลายเซ็น]</u>			ลายเซ็น : <u>[ลายเซ็น]</u>		
ชื่อ : <u>ธีระพงษ์ แก้วนิมพลี</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>20/03/67</u>			วันที่ : <u>20/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

 19 มี.ค. 2024 09:32:16 ตามล หนองแก อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 12	 19 มี.ค. 2024 15:31:48 ตามล หนองแก อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3
เตรียมงานติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 12	ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 3
 19 มี.ค. 2024 15:05:05 ตามล หนองแก อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ VEHHA HUAHIN	 19 มี.ค. 2024 15:30:13 ตามล หนองแก อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4
ส่งงานติดตั้ง SLEEVE PIPE ห้องพัก ชั้น 12	ประกอบท่อดับเพลิง ชั้น 4
 19 มี.ค. 2024 15:49:58 ตามล หนองแก อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 12	
ประกอบท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 5	ประกอบท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 5



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

 19 มิ.ย. 2024 15:33:47 123/61 Nong Kae-Taklap ตำบลหนองนก อำเภอท่าวุ้ง ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3	 19 มิ.ย. 2024 15:44:39 62/16 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองนก อำเภอท่าวุ้ง ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3
ติดตั้งซัพพอส ท่อ S,W,V,KW ชั้น B1	ติดตั้งซัพพอส ท่อ S,W,V,KW ชั้น B1
	
งานติดตั้งท่อ, BOX ฝังเสา SLEEVE FOR FIXTURE 11TH FLOOR (PART 1)	งานติดตั้งท่อ, BOX ฝังเสา SLEEVE FOR FIXTURE 12th FLOOR (PART 2)



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 20 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240321.HSL.TKA.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 2 แผ่น (หน้า 1/3)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 47 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	2	8. ชูการ	2		
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า	10		
3. ผู้ช่วยโครงการ	-	10. ช่างประปา			
4. สถาปนิก/วิศวกร	8	11. ช่างฉาบปูน	8		
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างเชื่อม	-		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. ช่างตีเหล็ก	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ	-		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Mobile Crane	-	4. Vibro hammer	-		
2. Silent Piler	-	5. Excavator	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Crawler crane	-		
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโบลเอ็นซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโบลเอ็นซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : <u>[ลายเซ็น]</u>			ลายเซ็น : <u>พ.จิตร</u>		
ชื่อ : <u>ธีระพงษ์ แก้วนิมพลี</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>21/03/67</u>			วันที่ : <u>21/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

	
เตรียมงานติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 12A	ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 3
	
ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 4	ประกอบท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 5
	
ประกอบท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 5	ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 4



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)



ติดตั้งท่อทองพื้น ชั้น 8

ตัวอย่าง



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน


ถึง : บริษัท ห้วยหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 21 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240322.HSL.TKA.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 2 แผ่น (หน้า 1/3)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 50 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	2	8. ชูการ	2	-	
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า	10		
3. ผู้ช่วยโครงการ	-	10. ช่างประปา	-		
4. สถาปนิก/วิศวกร	9	11. ช่างฉาบปูน	1		
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างเชื่อม	-		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. ช่างตีเหล็ก	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ	-		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Mobile Crane	-	4. Vibro hammer	-		
2. Silent Piler	-	5. Excavator	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Crawler crane	-		
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโบลเอ็นซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโบลเอ็นซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : <u>[ลายเซ็น]</u>			ลายเซ็น : <u>[ลายเซ็น]</u>		
ชื่อ : <u>ธีระพงษ์ แก้วนิมพลี</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>22/03/67</u>			วันที่ : <u>22/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

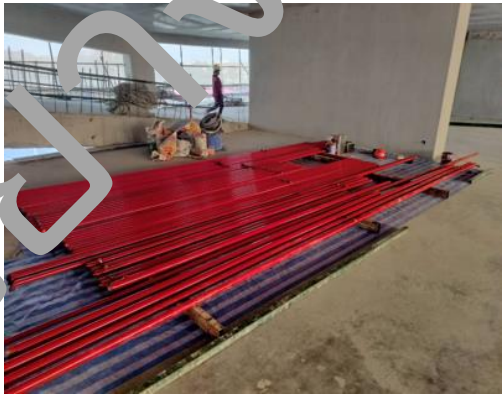	
เตรียมงานติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 12A	ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 3
	
ติดตั้งท่อ S,W,V,KW ชั้น B1	ประกอบท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 5
	
ติดตั้งท่อท้องพื้น ชั้น 8	



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท ห้วยหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 22 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชวิสรักษ์ สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240323.HSL.TKA.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 2 แผ่น (หน้า 1/3)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 28 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ชูการ	1	-	
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ช่างไฟฟ้า	-		
3. ผู้ช่วยโครงการ	-	10. ช่างประปา	-		
4. สถาปนิก/วิศวกร	2	11. ช่างฉาบปูน	1		
5. ผู้ควบคุมงาน	2	12. ช่างเชื่อม	-		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. ช่างตีเหล็ก	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ	-		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Mobile Crane	-	4. Vibro hammer	-		
2. Silent Piler	-	5. Excavator	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Crawler crane	-		
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโลเอ็นซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโลเอ็นซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : _____			ลายเซ็น : <u>พ.จิตร</u>		
ชื่อ : <u>ธีระพงษ์ แก้วนิมพลี</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>23/03/67</u>			วันที่ : <u>23/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน → จัดเก็บ ☒ PAC	

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

 22/3/24 14:51 น. VEHHA HUAHIN	 22 มี.ค. 2024 17:55:00 CHV
เตรียมงานติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 12A	ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอดรถ ชั้น 3
	 22 มี.ค. 2024 16:52:51 ตำบลหนองแม่ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 8
ติดตั้งท่อ S,W,V,KW ชั้น B1	ประกอบท่อดับเพลิง ห้องพัก ชั้น 8
	
งานติดตั้งท่อ, BOX SLEEVE FOR FIRE ALARM SYSTEM FOR CORRIDOR 15TH FLOOR PLAN	



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 23 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240325.HSL.TKA.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 2 แผ่น (หน้า 1/3)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 50 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	2	8. ชูการ	2		
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า	10		
3. ผู้ช่วยโครงการ	-	10. ช่างประปา			
4. สถาปนิก/วิศวกร	9	11. ช่างฉาบปูน	1		
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างเชื่อม	-		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. ช่างตีเหล็ก	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ	-		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Mobile Crane	-	4. Vibro hammer	-		
2. Silent Piler	-	5. Excavator	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Crawler crane	-		
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโลเอ็นซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอสโลเอ็นซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : <u>[ลายเซ็น]</u>			ลายเซ็น : <u>[ลายเซ็น]</u>		
ชื่อ : <u>ธีระพงษ์ แก้วนิมพลี</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>25/03/67</u>			วันที่ : <u>25/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

เอกสารแนบรายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

วันที่ทำงาน : 23 มีนาคม 2567

เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ

เลขที่ : DRP.2301.240325.HSL.TKA.1

(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้)

(หน้า 2/3)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ท้ายข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1.	เตรียม Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 12A	GL.8-15/A-D	3	100%	
2.	เชื่อมท่อดับเพลิง ลานจอด ชั้น 3	GL.1-5/A-D	5	100%	
3	ติดตั้งท่อ S,W,V,KW, ชั้น B.1	GL.8-15/D	5	80%	
4	ประกอบท่อดับเพลิง ชั้น 5	GL.1-8/A-D	5	80%	
5	ติดตั้งท่อทองพื้น ชั้น 8	GL.9-15/A-D	10	100%	

(หน้า 3/3)



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท ห้วยหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 24 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240325.HSL.TKA.2
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 2 แผ่น (หน้า 1/3)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 28 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	-	8. ชูการ	-	-	
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ช่างไฟฟ้า	10		
3. ผู้ช่วยโครงการ	-	10. ช่างประปา	-		
4. สถาปนิก/วิศวกร	5	11. ช่างฉาบปูน	5		
5. ผู้ควบคุมงาน	2	12. ช่างเชื่อม	-		
6. หัวหน้าคนงาน	-	13. ช่างตีเหล็ก	-		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	1	14. อื่นๆ	-		-
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Mobile Crane	-	4. Vibro hammer	-		
2. Silent Piler	-	5. Excavator	-		
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ	-	6. Crawler crane	-		
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : _____			ลายเซ็น : <u>พ.จิตร</u>		
ชื่อ : <u>ธีระพงษ์ แก้วนิมพลี</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>25/03/67</u>			วันที่ : <u>25/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

	
ติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 12	ติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 12 A
	
ประกอบท่อดับเพลิง ห้องพัก ชั้น 8	ส่งงานติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 12
	
งานติดตั้ง BLOCK OUT ฟังพินคอนกรีต SLEEVE FOR FIXTURE FOR 12TH FLOOR (PART 1)	



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 25 มีนาคม 2567
 เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240326.HSL.SCHU.1
 อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
 การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
 เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
 (รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 6 แผ่น (หน้า 1 / 10)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 55 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	2	8. ชูการ	5		ไม่มี
2. วิศวกรโครงการ	2	9. ช่างไฟฟ้า	10		
3. Safety		10. ช่างประปา	5		
4. สถาปนิก / วิศวกร	8	11. ช่างฉาบปูน	10		
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างเชื่อม	1		
6. หัวหน้าคนงาน		13. ช่างตีเหล็ก			แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ			
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			ไม่มี		
1. Mobile Crane		4. Vibro hammer			
2. Silent Piler		5. Excavator			
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ		6. Crawler crane			
รายงานโดย :	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	ทบทวนโดย :	บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		
ลายเซ็น :		ลายเซ็น :			
ชื่อ :	ศุภกร ชูจันทร์ทอง	ชื่อ :	วุฒิเลิศ ทองดี		
วันที่ :	25/03/67	วันที่ :	25/03/67		
ข้อเสนอแนะ :		ข้อเสนอแนะ :			
สำเนา : ☒ HSL ☐ ☐ ☐				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



ติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 12



ติดตั้งกล่องไฟในผนังชั้น 8



ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอดรถ ชั้น 3



ประกอบท่อดับเพลิง ห้องพัก ชั้น 8



งานติดตั้ง BLOCK OUT ฝังพื้นคอนกรีต SLEEVE FOR
FIXTURE FOR 13th FLOOR (PART 2)



งานติดตั้งท่อ, BOX ฝังพื้นคอนกรีตในบันไดของงานแสงสว่างและ
FIRE ALARM (FST01), (ชั้น 12 ขึ้นชั้น 13)





ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 26 มีนาคม 2567
 เรียน : คุณชวิสรักษ์ สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240327.HSL.SCHU.1
 อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
 การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
 เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
 (รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 6 แผ่น (หน้า 1 / 10)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ	
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”					
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 58 คน)			ปัญหาและอุปสรรค			
1. ผู้จัดการโครงการ	3	8. ชูการ	5		ไม่มี	
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า	10			
3. Safety		10. ช่างประปา	5			
4. สถาปนิก / วิศวกร	9	11. ช่างฉาบปูน	10			
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างเชื่อม				
6. หัวหน้าคนงาน		13. ช่างไม้	1			
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ				
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			แนวทางการแก้ไข			
1. Mobile Crane		4. Vibro hammer			ไม่มี	
2. Silent Piler		5. Excavator				
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ		6. Crawler crane				
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>			
ลายเซ็น : 			ลายเซ็น : 			
ชื่อ : <u>ศุภกร ชูจันทร์ทอง</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>			
วันที่ : <u>26/03/67</u>			วันที่ : <u>26/03/67</u>			
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____			
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ		

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



เตรียมงานติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 12



เดินท่อ W.V.KW ในผนังชั้น 8



ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอดรถ



ประกอบท่อดับเพลิง ห้องพัก ชั้น 8



ส่งงานติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 12 A



งานติดตั้ง BLOCK OUT ฝังพื้นคอนกรีต SLEEVE FOR FIXTURE
FOR 13th FLOOR (PART 2)



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท ห้วยหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 27 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240328.HSL.SCHU.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 6 แผ่น (หน้า 1 / 10)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 57 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	3	8. ชูการ	5		ไม่มี
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า	10		
3. Safety		10. ช่างประปา	4		
4. สถาปนิก / วิศวกร	9	11. ช่างฉาบผนัง	1		
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างฉาบ			แนวทางการแก้ไข
6. หัวหน้าคนงาน		13. ช่างโครงสร้าง	1		
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ			
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			ไม่มี		
1. Mobile Crane		4. Vibro hammer			
2. Silent Piler		5. Excavator			
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ		6. Crawler crane			
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น :			ลายเซ็น :		
ชื่อ : <u>สุกอร์ ชุนทร์ทอง</u>			ชื่อ : <u>วุฒิชัย ทองดี</u>		
วันที่ : <u>28/03/67</u>			วันที่ : <u>28/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



เตรียมงานติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 12




เดินท่อ W,V,KW ในผนังชั้น 8



ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอดรถ



ประกอบท่อดับเพลิง ห้องพัก ชั้น 8

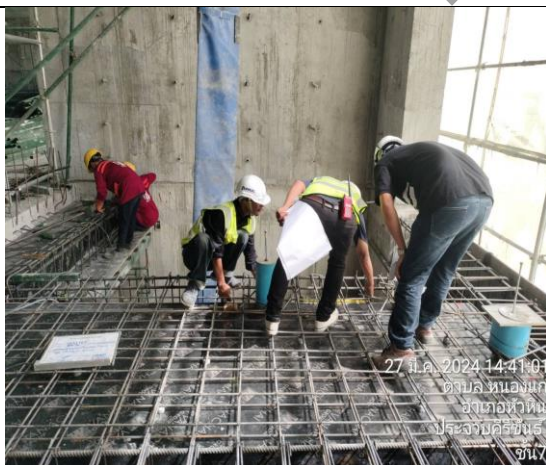

ส่งงานติดตั้ง Sleeve Pipe RL,FP,RD ชั้น 7



ส่งงานติดตั้ง Sleeve Pipe RL,FP,RD ชั้น 7



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 4/10)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



ส่งงานติดตั้ง Sleeve Pipe RL,FD,CW ชั้น 12



งานติดตั้งท่อ, B&CW สำหรับ SLEEVE FOR FIXTURE FOR 13th FLOOR

(PART 2)





ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 28 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240329.HSL.SCHU.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 6 แผ่น (หน้า 1 / 10)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 61 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	3	8. ชูการ	5		ไม่มี
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า	10		
3. Safety		10. ช่างประปา	8		
4. สถาปนิก / วิศวกร	9	11. ช่างฉาบปูน	10		
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างเชื่อม			
6. หัวหน้าคนงาน		13. ช่างตีเหล็ก	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ			
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			ไม่มี		
1. Mobile Crane		4. Vibro hammer			
2. Silent Piler		5. Excavator			
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ		6. Crawler crane			
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : 			ลายเซ็น : 		
ชื่อ : <u>ศุภกร ชูจันทร์ทอง</u>			ชื่อ : <u>วุฒิสส ทอดดี</u>		
วันที่ : <u>29/03/67</u>			วันที่ : <u>29/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____			เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ		

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 12



เคเบิ้ล W,V,KW ในผนังชั้น 8




ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอดรถ



เชื่อมท่อดับเพลิง ห้องพัก ชั้น 8



เดินท่อใต้ท้องพื้น S,W,KW,V ชั้น 8

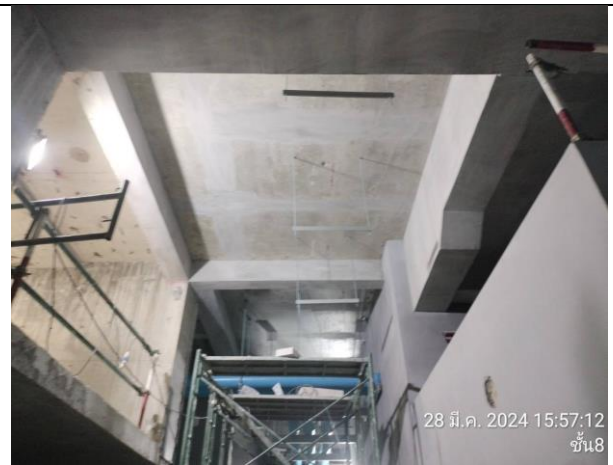

ติดตั้งซัพพอสท่อเมน CW ชั้น B1



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 4/10)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานติดตั้งท่อ, BOX ฝังพื้นคอนกรีตชั้น 7 ของงาน POWER
AND COMMUNICATION SYSTEM FOR 6th FLOOR

PLAN (PART 1)




ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 29 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240330.HSL.SCHU.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 6 แผ่น (หน้า 1 / 10)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 60 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	3	8. ชูการ	5		ไม่มี
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า	10		
3. Safety		10. ช่างประปา	8		
4. สถาปนิก / วิศวกร	8	11. ช่างฉาบปูน	10		
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างเชื่อม			
6. หัวหน้าคนงาน		13. ช่างตีเหล็ก	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ			ไม่มี
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Mobile Crane		4. Vibro hammer			
2. Silent Piler		5. Excavator			
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ		6. Crawler crane			
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : 			ลายเซ็น : 		
ชื่อ : <u>สุกอร์ ชูจันทร์ทอง</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเชส ทองดี</u>		
วันที่ : <u>30/03/67</u>			วันที่ : <u>30/03/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 12



เดินท่อ W,V,KW ในผนังชั้น 8



ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอดรถ



ติดตั้งท่อดับเพลิง ห้องพัก ชั้น 8



เดินท่อใต้ท้องพื้น RL ชั้น 8



งานติดตั้งท่อ, BOX ผังพื้นที่คอนกรีตชั้น 7 ของงาน POWER AND COMMUNICATION SYSTEM FOR 6th FLOOR PLAN (PART 1)





ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 30 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชรัสชัย สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240401.HSL.SCHU.1
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 6 แผ่น (หน้า 1 / 10)

ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 59 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	3	8. ชูการ	5		ไม่มี
2. วิศวกรโครงการ	3	9. ช่างไฟฟ้า	10		
3. Safety		10. ช่างประปา	8		
4. สถาปนิก / วิศวกร	7	11. ช่างฉาบผนัง	10		
5. ผู้ควบคุมงาน	3	12. ช่างฉาบ			
6. หัวหน้าคนงาน		13. ช่างโครงสร้าง	1		แนวทางการแก้ไข
7. ช่างเขียนแบบ	2	14. อื่นๆ			
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)			ไม่มี		
1. Mobile Crane		4. Vibro hammer			
2. Silent Piler		5. Excavator			
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ		6. Crawler crane			
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : 			ลายเซ็น : 		
ชื่อ : <u>ศุภกร ชูจันทร์ทอง</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>01/04/67</u>			วันที่ : <u>01/04/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน



งานติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 12



เดินท่อ W,V,KW ในผนังชั้น 8



ติดตั้งท่อดับเพลิง ลานจอดรถ



ติดตั้งท่อดับเพลิง ห้องพัก ชั้น 8



เดินท่อใต้ท้องพื้น RL ชั้น 8



ส่งตรวจงาน Sleeve Pipe ชั้น 12 A





ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

รายงานการทำงานประจำวัน

ถึง : บริษัท ห้วยหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด วันที่ทำงาน : 31 มีนาคม 2567
เรียน : คุณชวิสรักษ์ สุรการ เลขที่ : DRP.2301.240401.HSL.SCHU.2
อากาศ : ☒ แจ่มใส ☐ เมฆปกคลุม ☐ ลมแรง ☐ ฝนตกปรอยๆ ☐ ฝนตก ☐ อื่นๆ _____
การระงับงาน : ☐ งานเกิดเสียงดัง ☐ งานที่มีกลิ่น ☐ งานที่เกิดสะเก็ดไฟ ☐ ไฟฟ้าดับ ☐ อื่นๆ _____
เวลาเริ่มงาน : 08.00 น. เวลาเลิกงาน : 17.00 น. รวมเวลาทำงาน : 8 ชั่วโมง
(รายการงานที่ดำเนินการวันนี้) ☒ เอกสารแนบ จำนวน 6 แผ่น (หน้า 1/10)


ลำดับ ที่	รายการ โปรดทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ทำข้อความ กรณีเป็นงานที่เกิดสะเก็ดไฟ	สถานที่	จำนวน คนงาน	% งานที่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	“(รายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ)”				
กำลังคนประจำโครงการ (รวม = 30 คน)			ปัญหาและอุปสรรค		
1. ผู้จัดการโครงการ	1	8. ชูการ	ไม่มี		
2. วิศวกรโครงการ	1	9. ช่างไฟฟ้า			
3. Safety		10. ช่างประปา			
4. สถาปนิก/วิศวกร	4	11. ช่างฉาบผนัง			
5. ผู้ควบคุมงาน	2	12. ช่างฉาบ	แนวทางการแก้ไข		
6. หัวหน้าคนงาน		13. ช่างโครงสร้าง			
7. ช่างเขียนแบบ		14. อื่นๆ	ไม่มี		
เครื่องจักร (ระบุจำนวน)					
1. Mobile Crane		4. Vibro hammer			
2. Silent Piler		5. Excavator			
3. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ		6. Crawler crane			
รายงานโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>			ทบทวนโดย : <u>บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด</u>		
ลายเซ็น : 			ลายเซ็น : 		
ชื่อ : <u>ศุภกร ชูจันทร์ทอง</u>			ชื่อ : <u>วุฒิเลศ ทองดี</u>		
วันที่ : <u>01/04/67</u>			วันที่ : <u>01/04/67</u>		
ข้อเสนอแนะ : _____			ข้อเสนอแนะ : _____		
สำเนา : ☒ HSL ☐ _____ ☐ _____				เวียนภายใน ☒ PAC ☐ จัดเก็บ	

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)

(หน้า 3/10)

รูปถ่ายแนบรายงานการทำงานประจำวัน

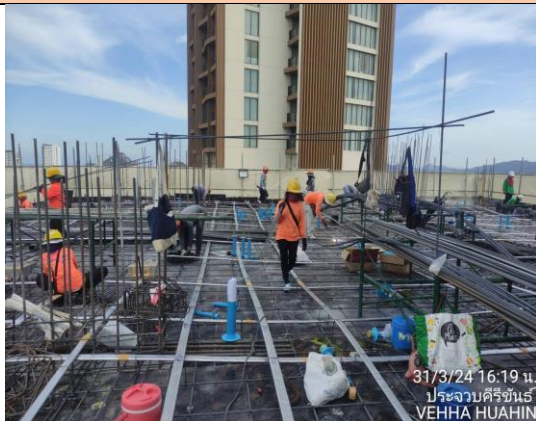

งานติดตั้ง Sleeve Pipe ห้องพัก ชั้น 14



งานติดตั้ง BOX ใส่ SLEEVE FOR FIXTURE FOR 13th FLOOR (PART 1)



ติดตั้งท่อดับเพลิง ห้องพัก ชั้น 8
